

Bo
Empalme
ante el pueblo


Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio


Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS! 





1. Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial - DIDE

1.1 El equipo de trabajo que conforma la DIDE



Equipo

1 Director

3 Subdirectores

38 Planta
2 LN – Asesor
2 CA – Asesor
31 CA – Profesional
2 CA – Secretario

218 Contratistas


Total : 260



Dirección De Infraestructura Y Desarrollo Empresarial - DIDE

Subdirección De Proyectos

1 Subdirector
15 Servidores Públicos de Planta
141 Contratistas

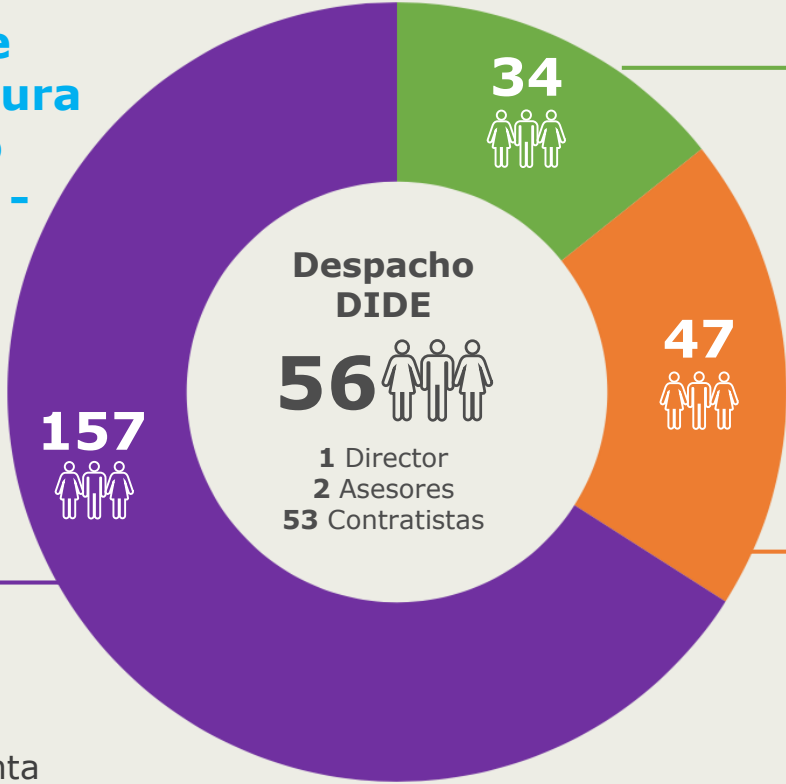

Subdirección De Programas

1 Subdirector
9 Servidores Públicos de Planta
24 Contratistas

Subdirección De Desarrollo Empresarial

1 Subdirector
12 Servidores Públicos de Planta
34 Contratistas



7. SEGUIMIENTO A METAS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE PROYECTOS



1.2 Avance Macrometas de Gobierno

De las cinco Macrometas, la DIDE reporta el cumplimiento de las siguientes cuatro:

I1 - 230 Proyectos de agua potable para el beneficio de población urbana y rural.



Hemos acompañado inversiones por



**\$740.153
Millones**

I2 - 133 Proyectos de agua potable para el beneficio de población rural



Hemos acompañado inversiones por



**\$162.278
Millones**

I3 - 97 Proyectos de agua potable para el beneficio de población urbana



Hemos acompañado inversiones por



**\$577.875
Millones**

I5 - 32.000 conexiones de agua potable apoyadas financieramente por la Nación



Hemos acompañado inversiones por



**\$80.563
Millones**



7. SEGUIMIENTO A METAS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE PROYECTOS



1.3 Proyectos de Inversión – Horizonte de tiempo

Gerenciados por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

BPIN	Ficha/Rubro	Proyecto		Horizonte
2017011000049	400101-4003-1400-0011	Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional	Proyectos Estratégicos APSB	2018-2027
2017011000379	400101-4003-1400-0012	Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	BID Mocoa	2018-2027
2018011001131	400101-4003-1400-0016	Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali	EMCALI	2019-2033
2021011000058	400101-4003-1400-0017	Implementación del programa de agua potable y alcantarillado para el departamento de La Guajira	BID Guajira	2021-2027
202300000000434	400101-4003-1400-0019	Mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el distrito industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura Valle del Cauca	CAF - Buenaventura	2023-2030
202500000025366	400101-4003-1400-0021	Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la sostenibilidad y la equidad territorial a nivel nacional	Nuevo proyecto agua (CIPE)	2026-2035



7. SEGUIMIENTO A METAS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS




5. GESTIÓN DE PROYECTOS



Proyectos de Inversión – Apropiación y compromiso presupuestal

Gerenciados por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Compromiso presupuestal de proyectos de inversión

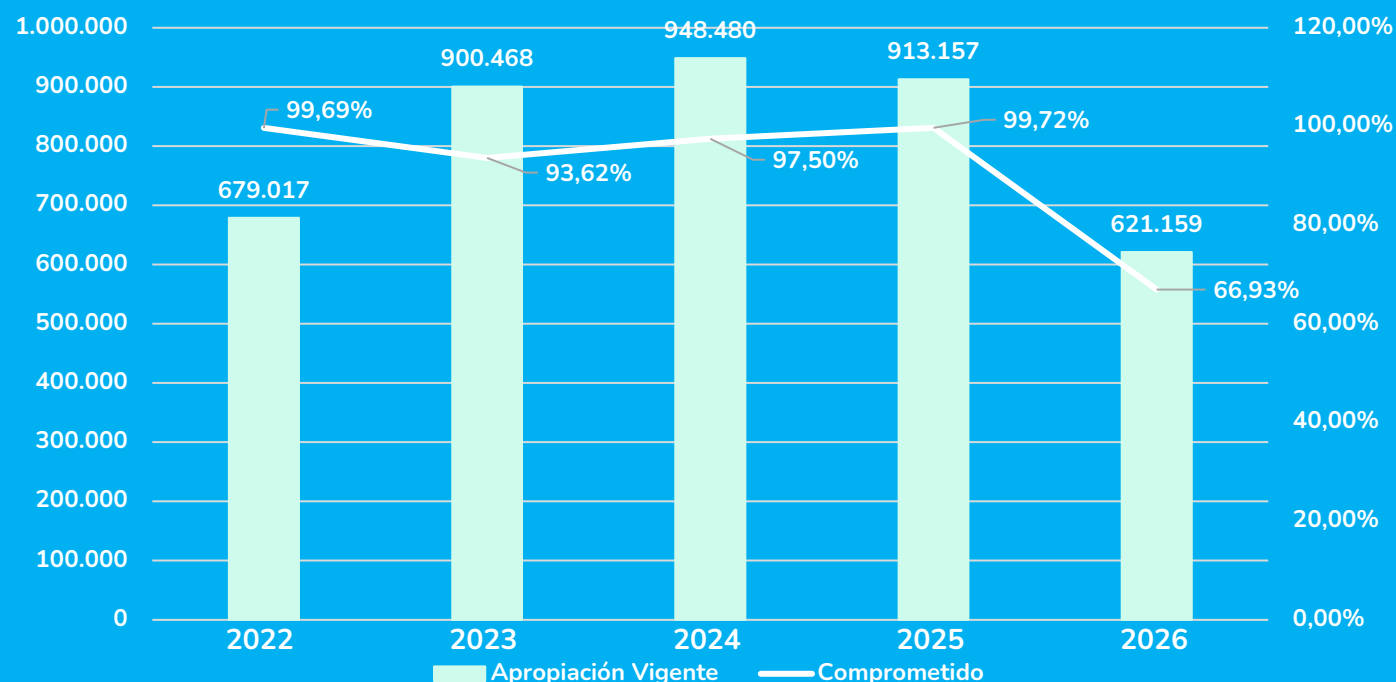

La DIDE gerencia

6 proyectos de inversión



Presupuesto gestionado

\$4 B

En apropiaciones

92,8%

Comprometido

Vigencias futuras por

\$3,5 billones

(\$309.001 millones en 2026)

Corte 30 de junio de 2026



7. SEGUIMIENTO A METAS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE PROYECTOS



1.4 Legados

Transformación sectorial hacia la garantía del derecho al agua

Enfoque del Legado

- 1 Modificación Resolución 0661 de 2019
- 2 Publicación del mecanismo de evaluación
- 3 Viabilización de 22 proyectos — Comité “Agua es Vida”
- 4 Plan de choque para proyectos críticos

Resultados Claves



Publicación proyectos VASB

Publicación del tablero para proyectos que ingresan al mecanismo de viabilización (Resolución 0661 de 2019)



Transformación del esquema de financiación sectorial

\$3,5B

vigencias
futuras
aseguradas

46

proyectos
estratégicos
vía CONPES DIE



Herramienta de Seguimiento y Control

Resolución 140 de 2018 · Supervisiones CUR Proyectos Críticos



7. SEGUIMIENTO
A METAS



9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE
PROYECTOS



1.4.1 Actualización evaluación proyectos VASB

Principales resultados: Procedimiento administrativo para la evaluación, concepto de viabilidad, apoyo financiero, seguimiento y reformulación de proyectos de agua y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. Actualización de la reglamentación del art. 250 - Ley 1450 de 2011 Deroja Resoluciones 661 de 2019 y 418 de 2021

Logro: Elaboración proyecto de Resolución + anexos técnicos - formatos

Evaluación y concepto de viabilidad de proyectos

- Requisitos de presentación
- Revisión preliminar y verificación requisitos (plazos)
- Concepto técnico de viabilidad

Función DIDE

Dar viabilidad a proyectos susceptibles de financiación

Apoyo financiero de la Nación

- Criterios de priorización para el cierre de brechas
- Lineamientos para solicitud y asignación de recursos PGN MVCT

Función VASB

Coordinar la financiación de proyectos con recursos Nación

Seguimiento y Reformulación de proyectos

- Recursos para la gestión de proyectos 2%
- Lineamientos para seguimiento y reformulación de proyectos

Función DIDE

Realizar seguimiento a proyectos financiados con recursos Nación



7. SEGUIMIENTO
A METAS



9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS




5. GESTIÓN DE
PROYECTOS

Mecanismo Actual de Evaluación y Viabilización

De la revisión documental a la viabilización

Resolución 0661 2019

Un proceso estructurado y su estrategia de descongestión para acelerar la evaluación de proyectos

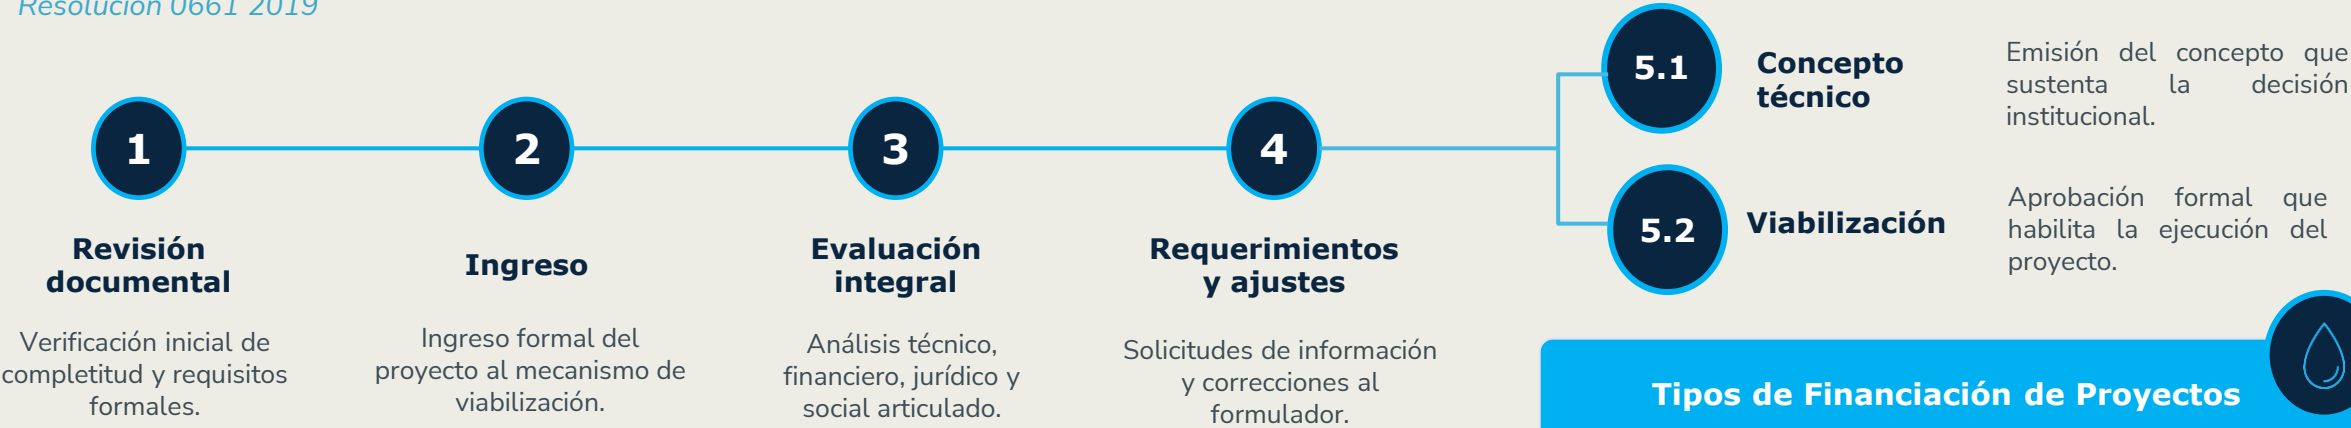

1. Control de Calidad

- Revisión rigurosa
- Devolución temprana
- Fortalecimiento de capacidades de formulación
- Acompañamiento técnico previo



2. Eficiencia

- Estandarización lista de chequeo
- Evaluación integral y articulada
- Mesas de trabajo permanentes



3. Trazabilidad

- Tableros de seguimiento (Planner)
- Aplicación estandarizadas de devolución
- Seguimiento permanente

Tipos de Financiación de Proyectos



7. SEGUIMIENTO A METAS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE PROYECTOS

1.4.2 Fortalecimiento de SIGEVAS

De procesos dispersos a una plataforma integrada



Situación Identificada

- Uso de múltiples archivos Excel no regulados para consolidar información crítica de proyectos
- Información dispersa y doble registro
- Riesgo de pérdida de información
- Limitaciones para el seguimiento y la toma de decisiones

Acciones Y Avances

- Definición de arquitectura de información
- Parametrización de variables estratégicas
- Diseño de visor de seguimiento ciudadano
- Fortalecimiento de trazabilidad institucional
- Mesas técnicas interdisciplinarias y levantamiento de requerimientos funcionales
- Identificación de fuentes de información y diseño del plan de parametrización

+50

Variables estratégicas
identificadas

5

Dimensiones de
parametrización



Reducción de registros
externos



Calidad y disponibilidad de
información

Parametrización SIGEVAS · 5 Dimensiones Estratégicas

Gestión del ciclo del proyecto

Estado · Cronogramas ·
Avances · Hitos

Gestión financiera

Desembolsos · Recursos ·
SalDOS · Rendimientos

Gestión territorial

Zona · Región · Cobertura
· Coordenadas

Alertas y control

Semáforos · Alertas ·
Vencimientos · Planes de
acción

Gestión gerencial

Madurez · Dificultad ·
Reportes ejecutivos ·
Priorización

Fortalecimiento De SIGEVAS

Bases técnicas del SIG-SDE y hoja de ruta institucional

Componentes estratégicos modelados y horizonte de consolidación de la transformación digital

+20

Productos técnicos desarrollados

5

Componentes estratégicos modelados

100%

Modelamiento en fase actual completado

Sig-sde · Componentes Estratégicos Modelados

Plan de Aseguramiento de la Prestación - PAP

- Levantamiento funcional
- Modelo lógico y relacional
- Catálogo de indicadores

Plan de Gestión Social - PGS

- Análisis Resolución 895/2021
- Estructuración de información
- Modelamiento funcional

Agua Potable y Saneamiento Básico Institucional

- Integración de información territorial
- Modelamiento geográfico
- Estructuras funcionales

Huella Azul

- Modelamiento de 6 módulos
- Consolidación de variables
- Arquitectura corporativa de datos

Componente Social (Convenio Uso de Recursos)

- Arquitectura funcional
- Gestión documental
- Definición de roles

Próximos Pasos · Hoja De Ruta

1 Corto plazo

- Culminar parametrización prioritaria
- Implementar tableros gerenciales
- Consolidar estrategia de descongestión

2 Mediano plazo

- Integrar nuevas fuentes de información
- Automatizar procesos de seguimiento
- Interoperar con sistemas documentales

3 Largo plazo

- Analítica avanzada
- Modelos predictivos
- Ecosistema sectorial de información

La optimización del mecanismo de evaluación y el fortalecimiento de los sistemas de información consolidan una gestión más eficiente, transparente, trazable y orientada a resultados para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.



1.4.3 Herramienta de seguimiento y control

Logro: Reducción neta del 55% en el volumen de proyectos reportados



28 de 51
Proyectos
devueltos

55%
de los proyectos
depurados

Inversión de los
proyectos
\$ 598.813.329.073




2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Agosto 2022 – Junio 2026



Proyectos para Agua y Saneamiento Básico

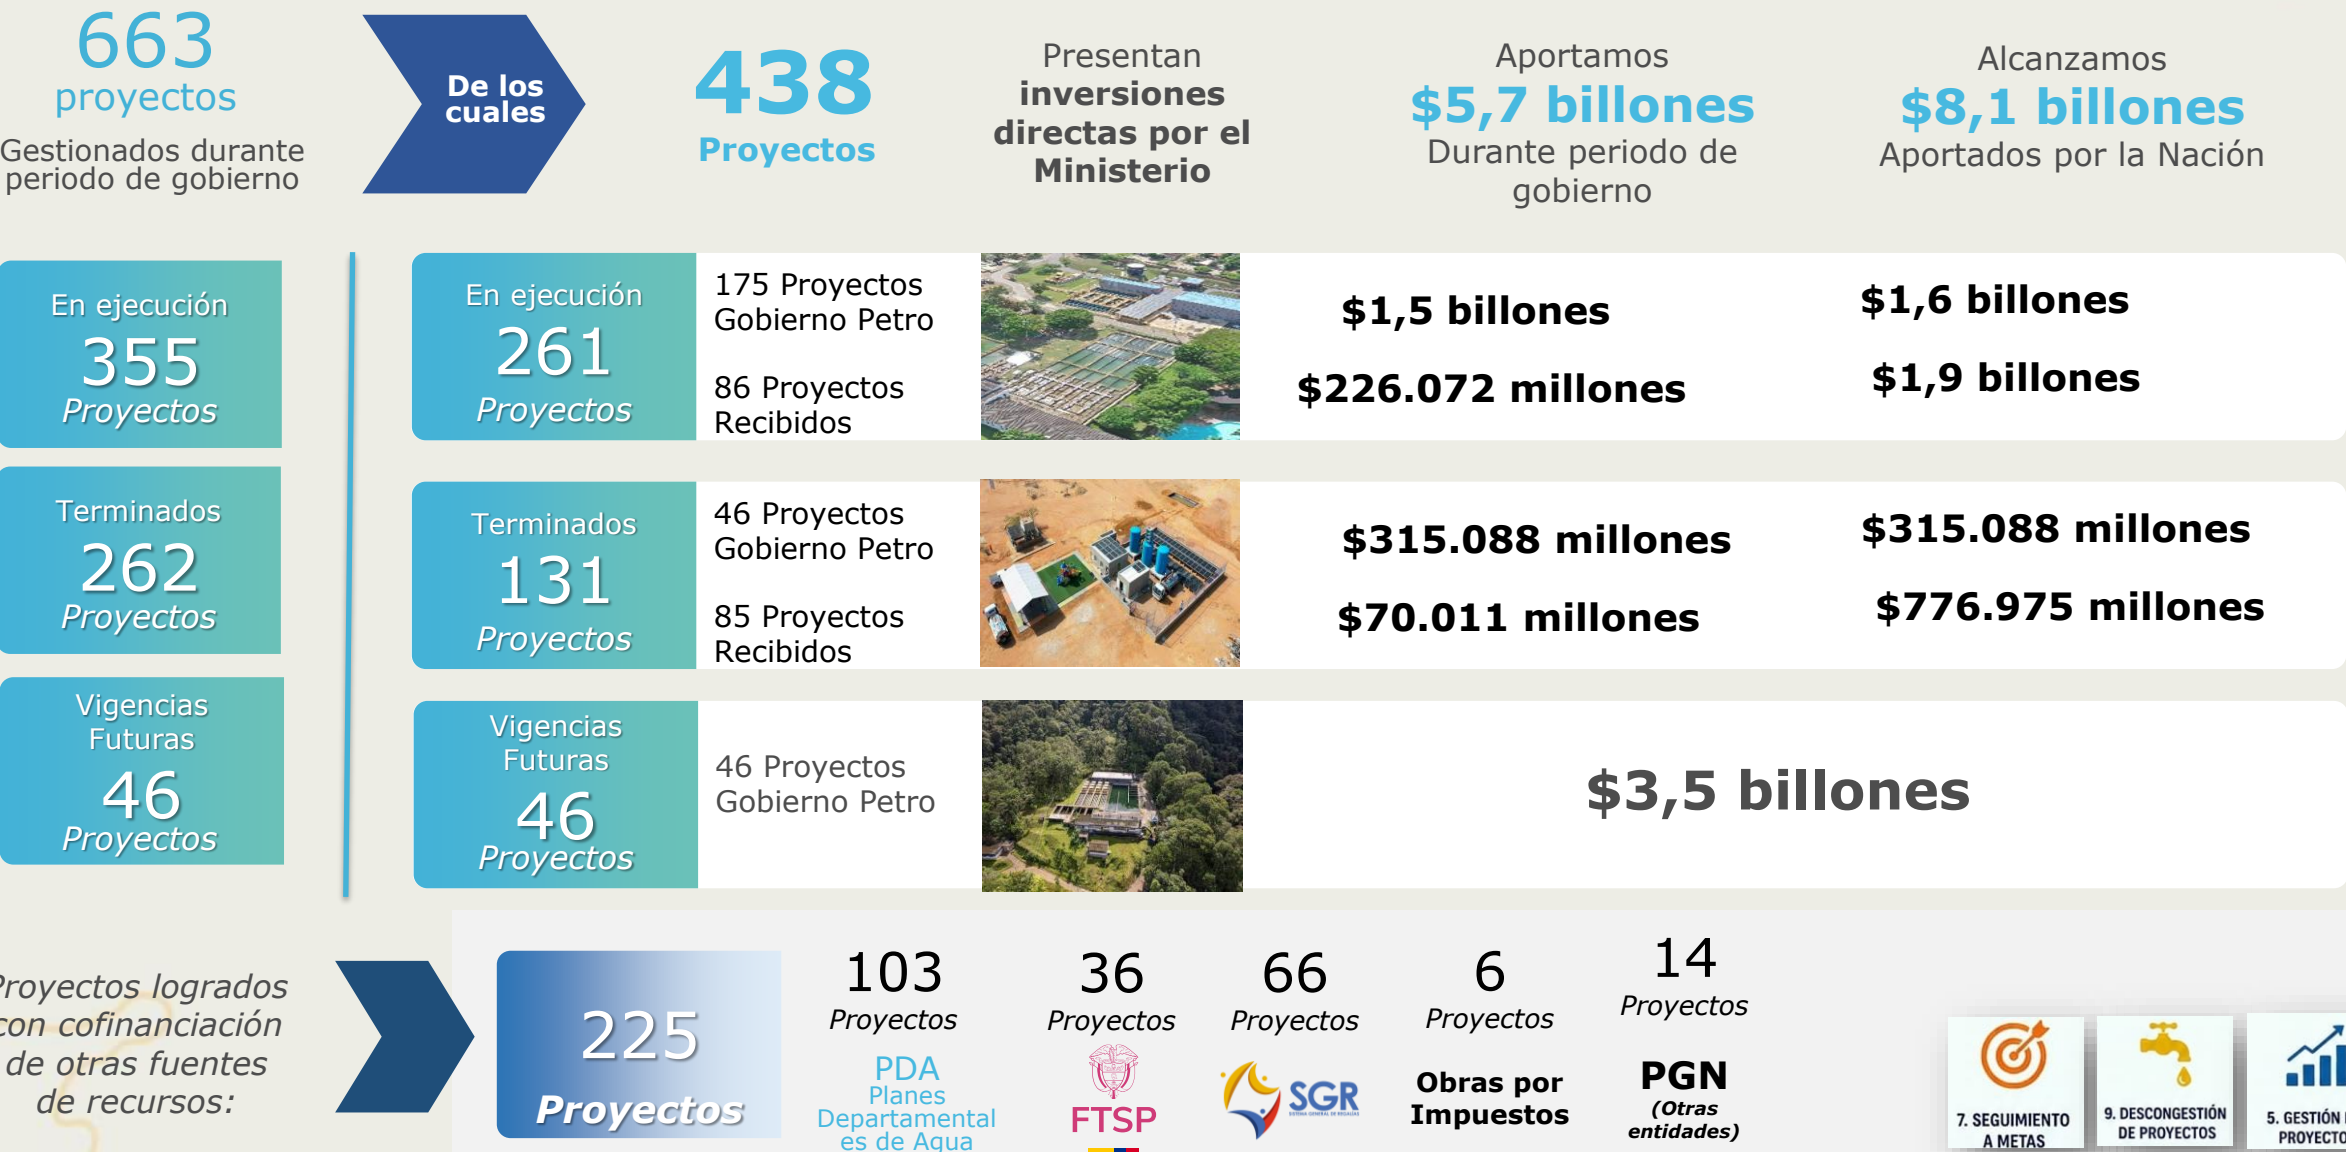




2.1 Mecanismo de Evaluación de Proyectos

Agosto 2022 – Junio 2026

2.1.1 Descongestión del Mecanismo de Evaluación

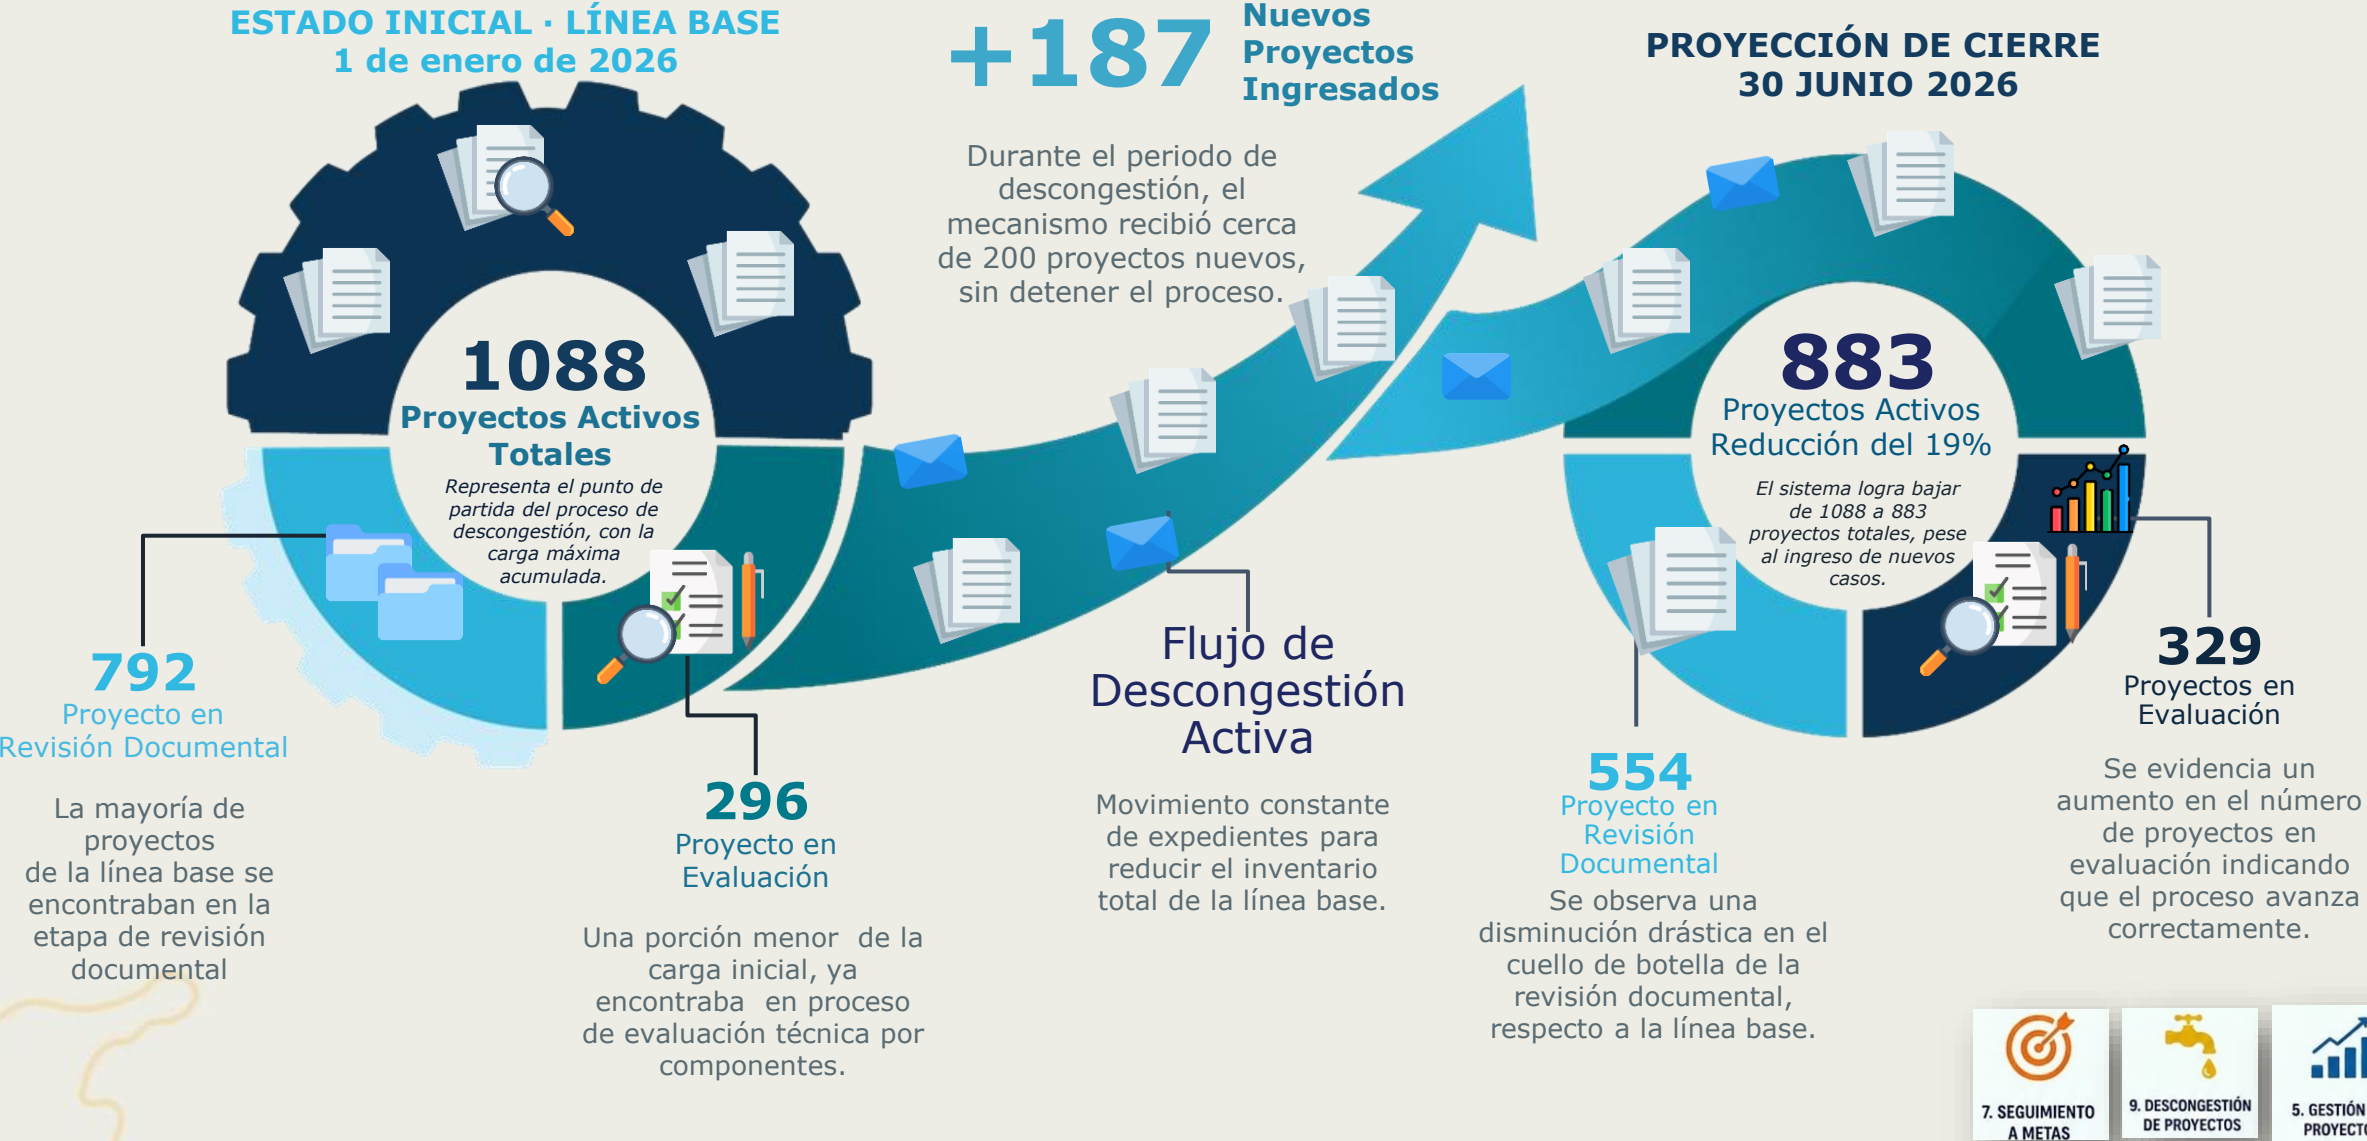


Estado Actual Mecanismo de Evaluación

883 *Proyectos Activos*

PROYECTOS POR DEPARTAMENTOS		
DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE PROYECTOS	VALOR TOTAL APROX
AMAZONAS	3	\$ 1.465.417.303
ANTIOQUIA	48	\$ 601.675.496.912
ARAUCA	20	\$ 421.657.398.970
ATLANTICO	20	\$ 217.783.256.016
BOLÍVAR	34	\$ 1.138.577.981.324
BOYACA	60	\$ 483.370.915.503
CALDAS	9	\$ 132.386.027.317
CASANARE	21	\$ 343.716.211.546
CAUCA	38	\$ 591.476.594.746
CESAR	43	\$ 898.930.946.380
CHOCÓ	42	\$ 539.858.865.363
CÓRDOBA	38	\$ 508.342.245.519
CUNDINAMARCA	55	\$ 576.647.398.109
GUAINÍA	4	\$ 51.430.001.890
GUAVIARE	6	\$ 92.250.084.208
HUILA	43	\$ 354.173.977.921

PROYECTOS POR DEPARTAMENTOS		
DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE PROYECTOS	VALOR TOTAL APROX
LA GUAJIRA	29	\$ 501.445.161.813
MAGDALENA	27	\$ 656.441.834.711
META	16	\$ 325.392.155.017
N DE SANTANDER	21	\$ 1.461.909.944.969
NARIÑO	72	\$ 859.258.021.519
PUTUMAYO	20	\$ 218.794.227.323
QUINDIO	9	\$ 97.971.246.656
RISARALDA	5	\$ 71.002.097.109
SAN ANDRÉS	1	\$ 13.967.232.069
SANTANDER	39	\$ 1.948.257.503.913
SUCRE	29	\$ 377.994.830.358
TOLIMA	47	\$ 578.637.568.153
VALLE DEL CAUCA	60	\$ 1.395.571.921.377
VAUPES	8	\$ 81.323.288.483
VICHADA	5	\$ 63.632.774.614
Total general	883	\$ 15.916.146.384.134

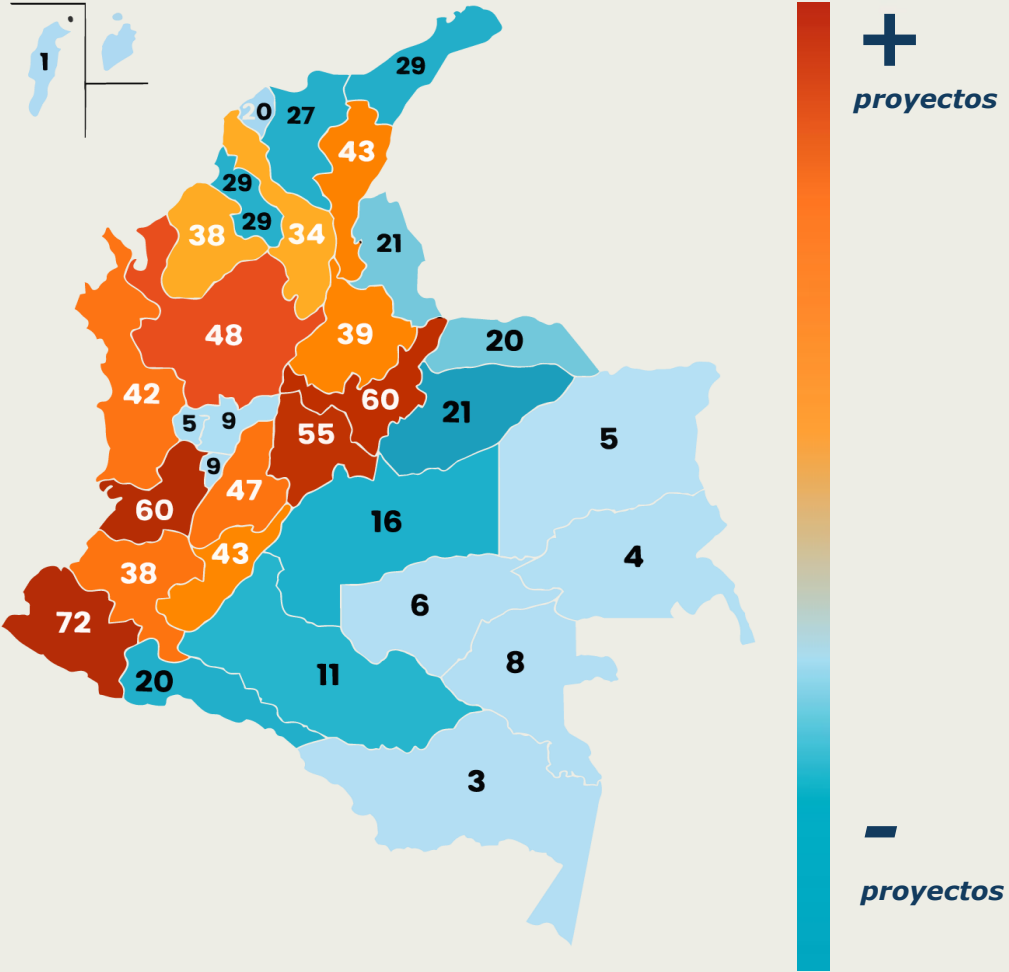



7. SEGUIMIENTO A METAS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE PROYECTOS

Estado Actual Mecanismo de Evaluación

883 Proyectos Activos



Foto: PTAR Mocoa

En Evaluación (37%)




Fase de
evaluación
activa.



\$6,48
Billones
Valor de Inversión

En Revisión Documental (63%)

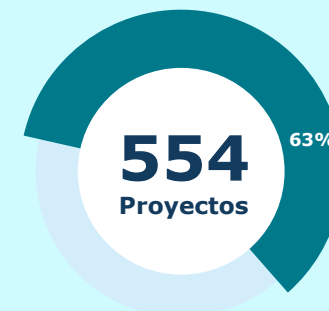

Mayoría en
fase de
validación de
documentos.



\$9,43
Billones
Valor de Inversión

Proyectos
en Total

Representa el volumen
total de la cartera de
inversión gestionada
actualmente.

883

\$15,9

De
Inversión

Valor total aproximado
acumulado de todos los
proyectos en revisión y
evaluación



Estado Actual Mecanismo de Evaluación

883 Proyectos Activos – Tipo y Ubicación de Proyecto


Tipos de Proyectos



Acueducto
318
Proyectos (36%)



Alcantarillado
235
Proyectos (27%)



Unidades Sanitarias
171
Proyectos (19%)



Consultorías
64 Proyectos (7%)



Acueducto y Alcantarillado
55 Proyectos (8%)



Aseo
40 Proyectos (5%)



Alcantarillado
\$8.18 Billones
(51%+)



Acueducto
\$3.98 Billones



Unidades Sanitarias
\$1.50 Billones



Acueducto y Alcantarillado
\$1.49 Billones



Consultorías
\$0.43 Billones



Aseo
\$0.31 Billones



Rural

54%
Liderazgo en volumen

Representa la mayoría con **474 proyectos** ejecutados.



Ubicación

Urbano
45%

Concentración significativa

Suma un total de **399 proyectos** en zonas urbanas.



Urbano y Rural

1%
Alcance mixto

Una minoría estratégica de **10 proyectos** con cobertura en ambas zonas.



5. GESTIÓN DE PROYECTOS




9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



7. SEGUIMIENTO A METAS

2.1.2 Conceptos Favorables sin Financiación - Viabilidades

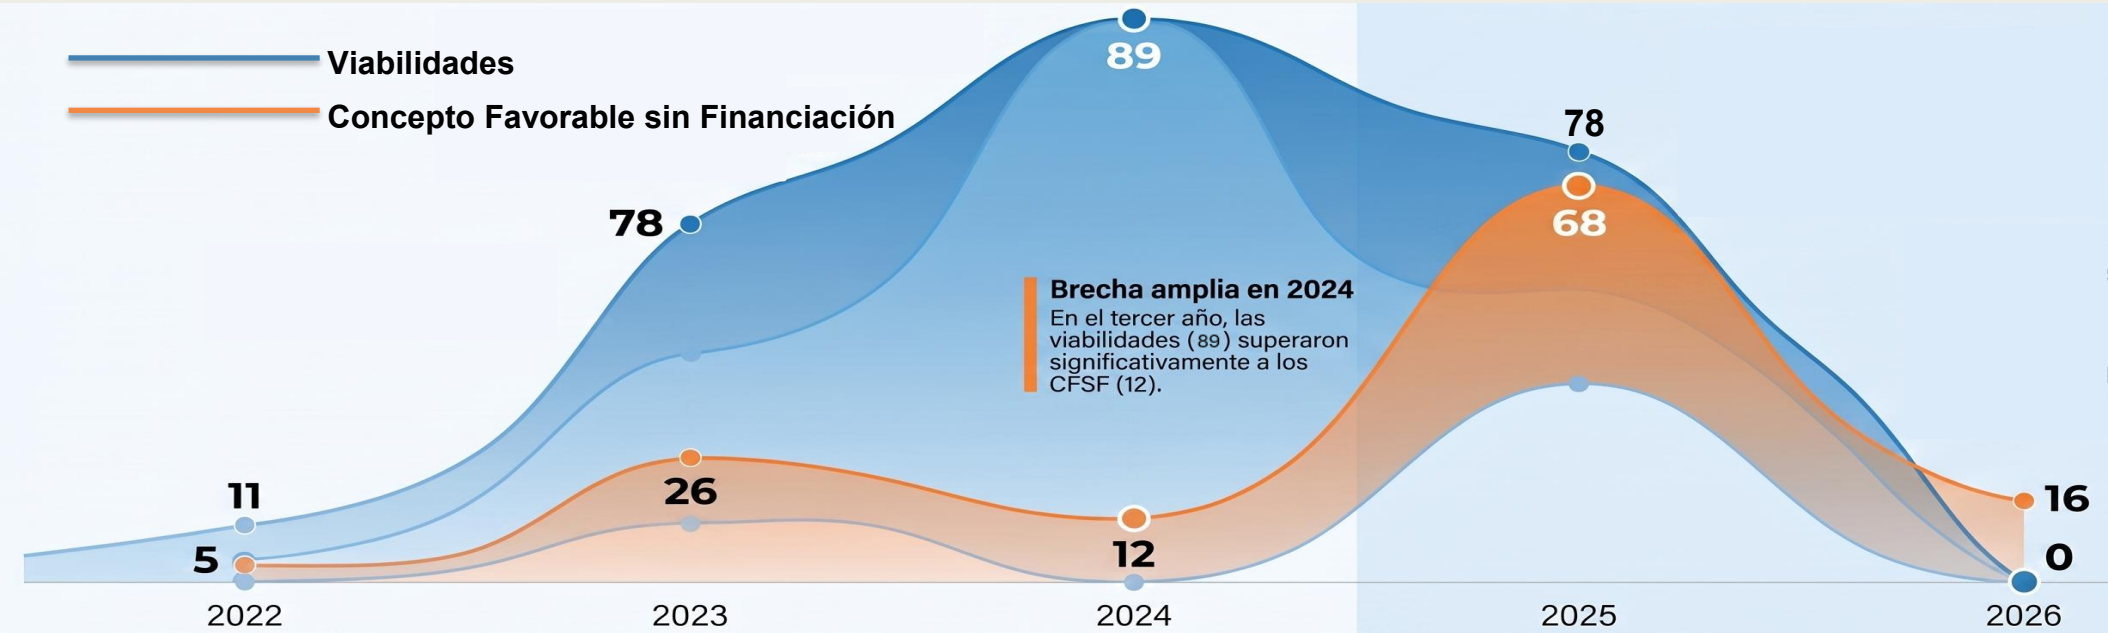

Año Gobierno	Viabilidades	CFSF
1° Año Gobierno (2022)	11	5
2° Año Gobierno (2023)	78	26
3° Año Gobierno (2024)	89	12
4° Año Gobierno (2025)	78	68
5° Año Gobierno (2026)	0	16




A photograph of a water treatment facility. In the foreground, there's a concrete channel with turbulent water flowing through it. To the left, a blue-painted metal wall or structure runs along the channel. Above the channel, there are large blue pipes and concrete structures. A yellow excavator arm is visible in the background. A small sign on a post reads "PROCESO DE COAGULACIÓN".

2.2 Seguimiento a la ejecución Subdirección de Proyectos

Agosto 2022 – Junio 2026

2.2.1 Cuatro frentes de gestión para asegurar seguimiento en todo el país



Zona Norte: 7 Departamentos

(Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, San Andrés, Sucre).



Zona Pacífico: 4 Departamentos

(Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó).



Zona Centro: 3 Departamentos + Distrito

(Santander, Antioquia, Cundinamarca, Bogotá D.C.).



Zona Sur: 17 Departamentos

(Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, Boyacá, Arauca, Casanare, N. de Santander, Guaviare, Caldas, Quindío, Risaralda).

El equipo de 57 profesionales de seguimiento se distribuye estratégicamente para cubrir la diversidad y complejidad de las 4 zonas del país.

* El seguimiento de los proyectos del Departamento de La Guajira es realizado por un grupo especial de seguimiento que no hace parte de la Subdirección de Proyectos.



7. SEGUIMIENTO
A METAS




9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE
PROYECTOS

Anatomía financiera: El 82% del presupuesto se ejecuta a través de convenios



El portafolio de convenios asciende a **\$5.372.875.270.092**, con un aporte histórico de la Nación que promedia el **80%** de los recursos.



La inversión en convenios refleja un fuerte énfasis en el Norte y el Pacífico

Zona Norte
\$1.79
Billones
87 proyectos



Zona Pacífico
\$1.36
Billones
63 proyectos



Zona Centro
\$1.16
Billones
63 proyectos



Zona Sur
\$1.03
Billones
88 proyectos




Totales de Convenios: **301** Proyectos distribuidos en **26** departamentos activos.




Radiografía departamental: Concentración de capital en el Norte y Pacífico

Norte - Top Departamentos por Inversión

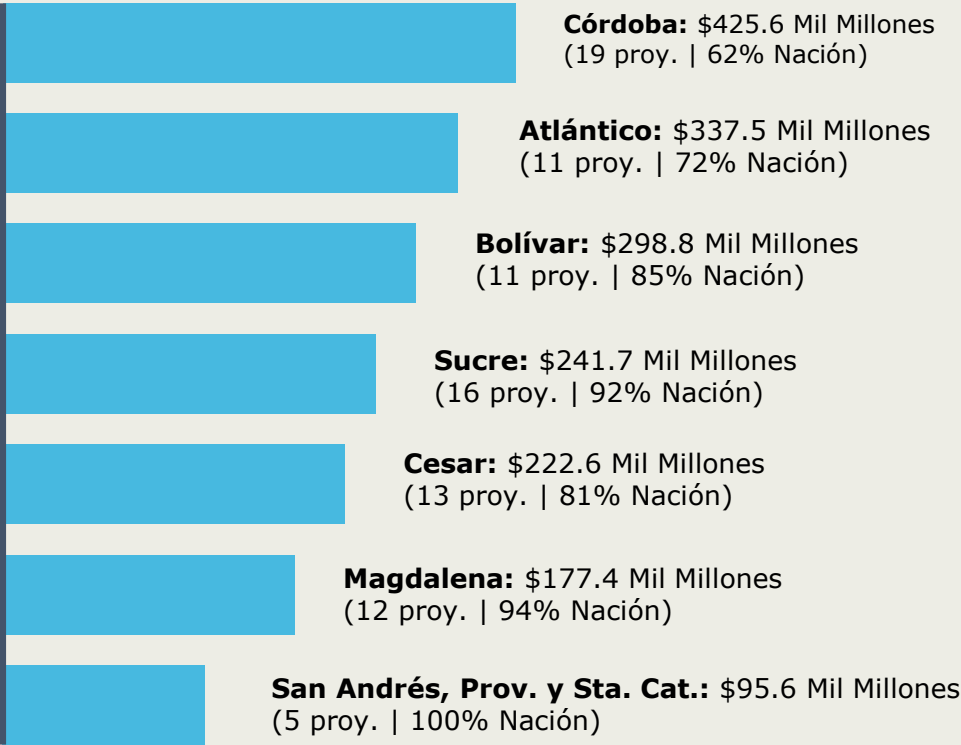


Pacífico - Top Departamentos por Inversión

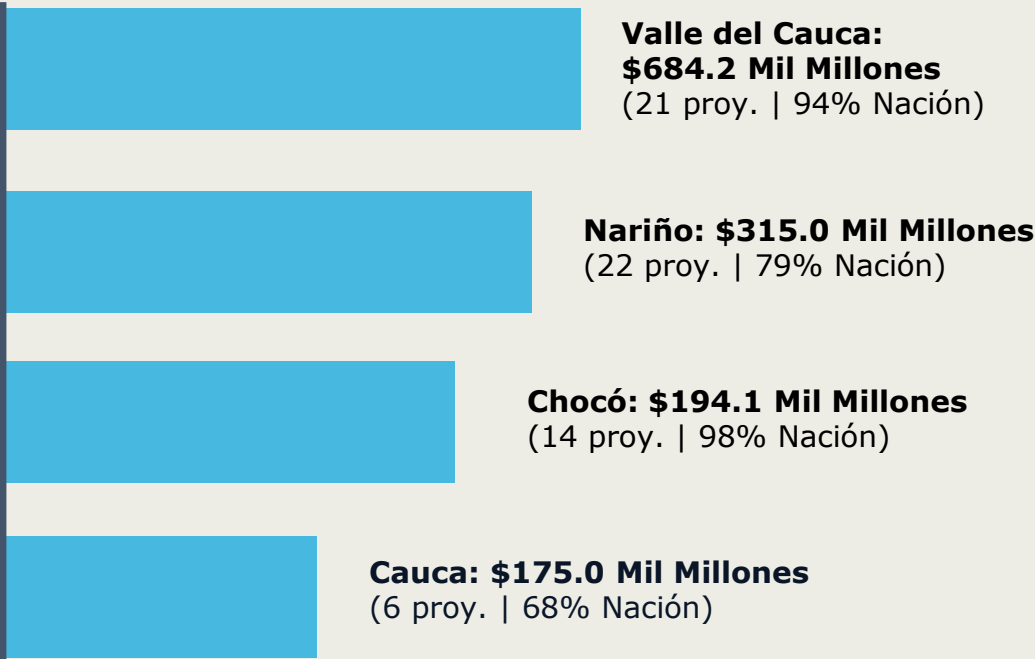


Radiografía departamental: Distribución extendida en zonas Centro y Sur

Centro - Distribución

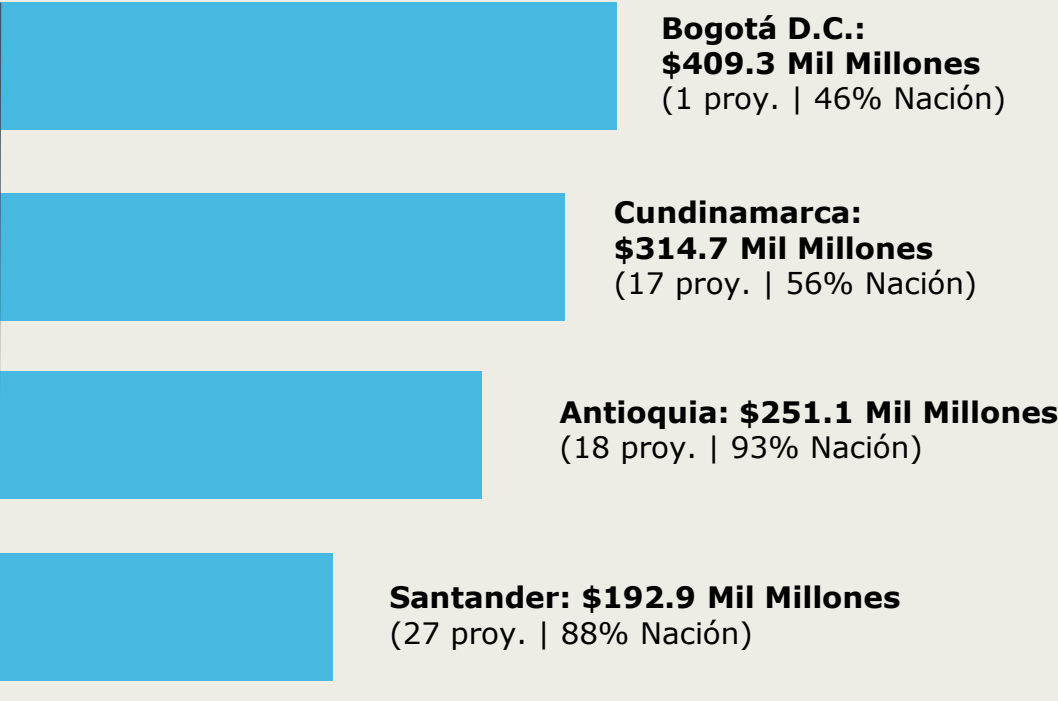

Sur - Top 7 Departamentos por Inversión

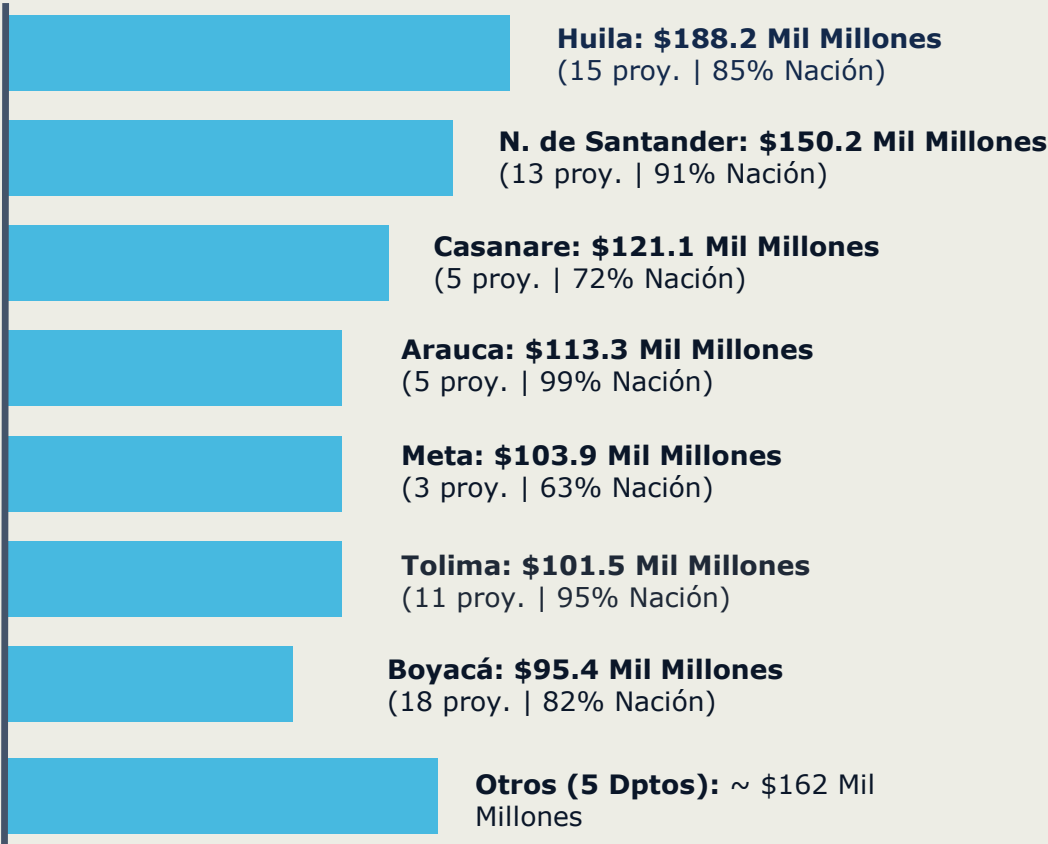

Estados de los Proyectos

Gestión Activa y Cierres - 179 Proyectos



En Ejecución:

85 Proyectos | \$2.39 Billones

Terminado:

56 Proyectos | \$795 Mil Millones

Liquidado:

38 Proyectos | \$188 Mil Millones

En Trámite - 62 Proyectos



Por Iniciar Contratación:

33 Proyectos | \$849 Mil

Millones En Liquidación:

25 Proyectos | \$160 Mil

Millones Pendiente Viabilidad:

4 Proyectos | \$211 Mil Millones

Alertas y Detenciones - 60 Proyectos



Suspendido:

46 Proyectos | \$693 Mil Millones

Cancelado:

10 Proyectos | \$72 Mil Millones

En Liquidacion Judicial:


4 Proyectos | \$10 Mil Millones

Mapeo sobre el universo de 301 convenios (\$5.37 Billones).



2.2.2 Obras por Impuestos

El Motor de Impacto

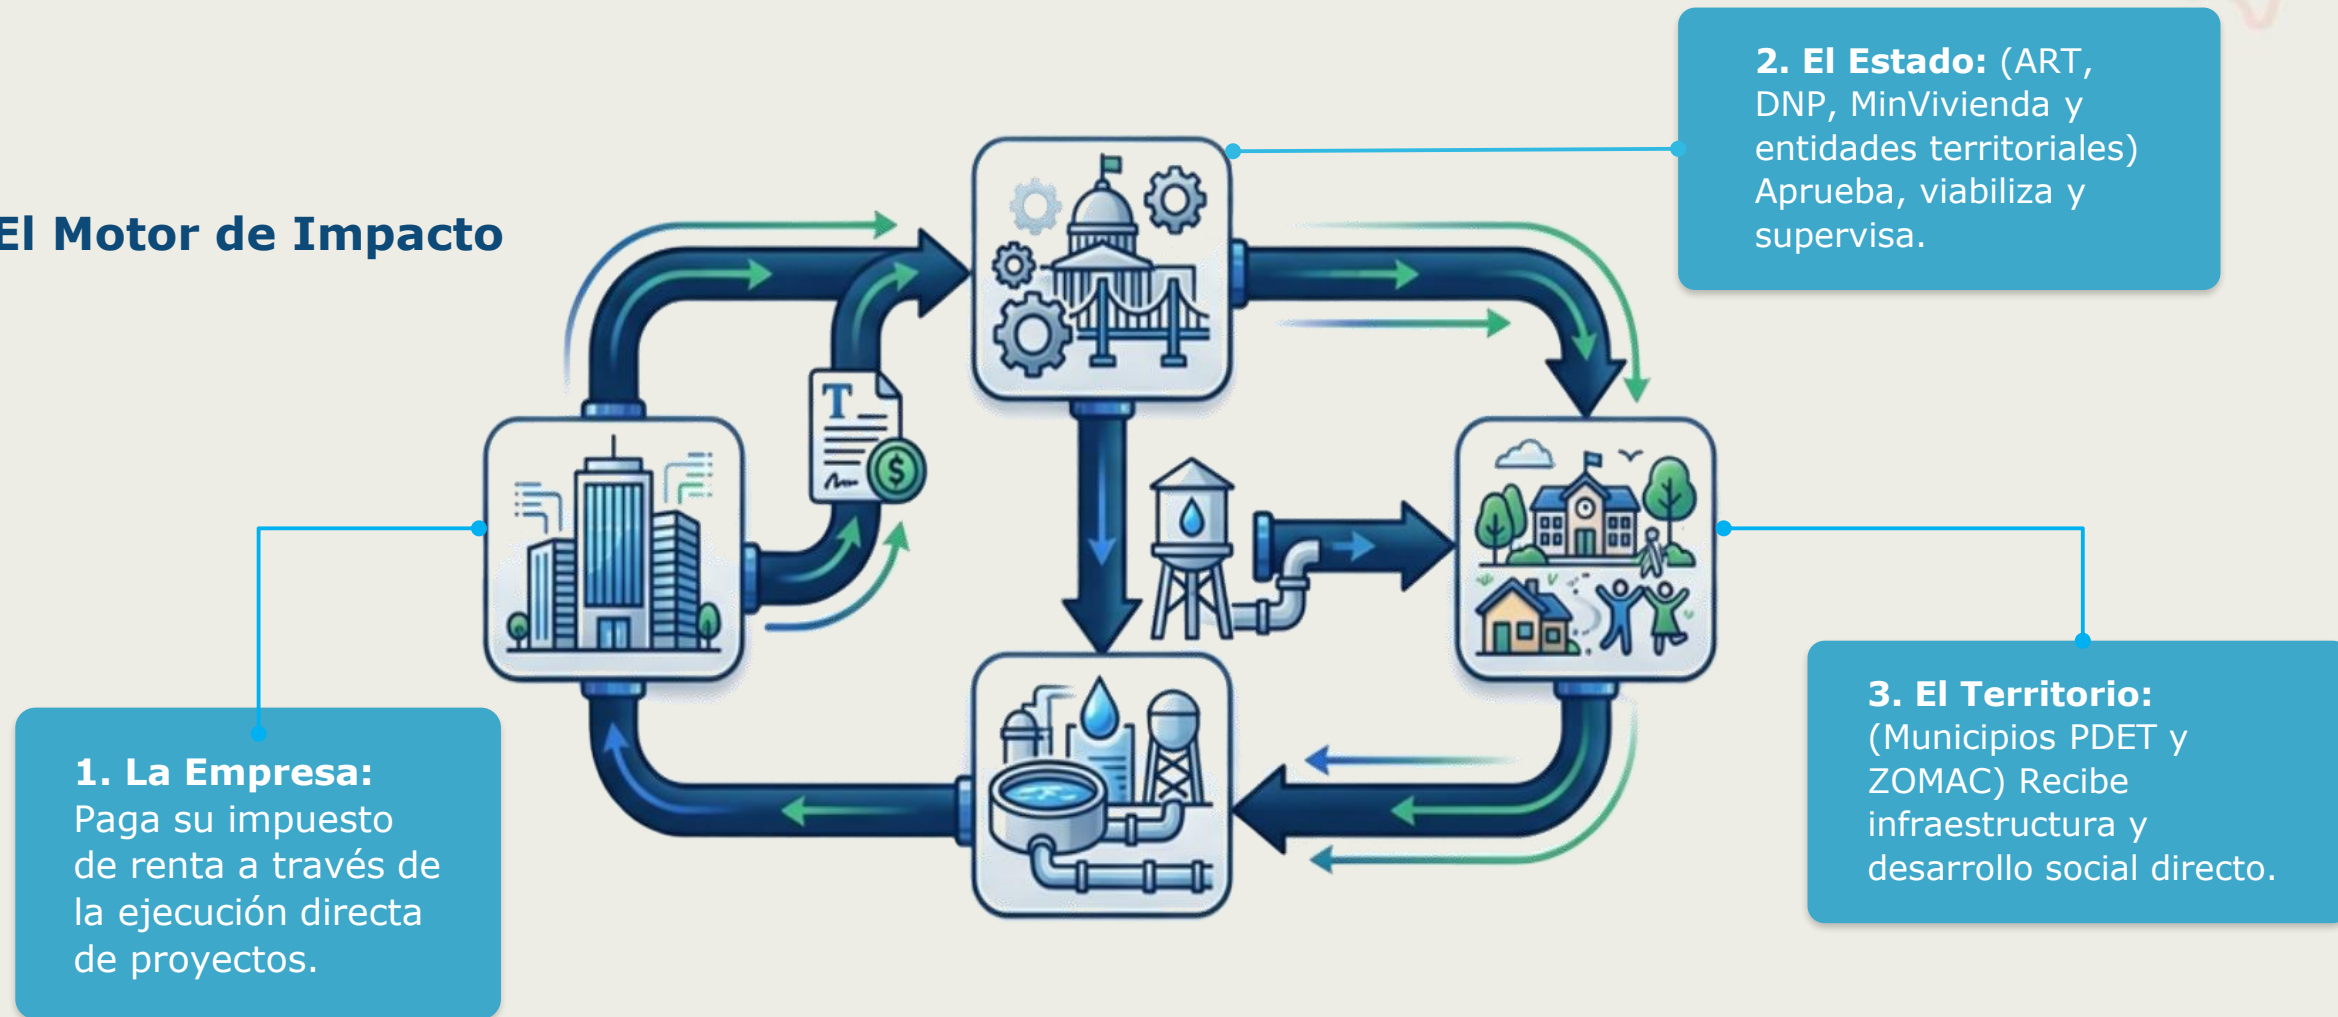

Sustento Legal: Ley 1819 de 2016 & Decreto 1915 de 2017.



La Matriz del Triple Impacto



Económico / Empresarial

Beneficio Directo:

Descuento directo del impuesto de renta.

Efecto Macro:

Fortalecimiento y descentralización de la inversión privada en las regiones.




Social / Comunitario

Objetivo Primario:

Reducción acelerada de brechas sociales.

Impacto:

Desarrollo territorial e impacto social directo en comunidades históricamente vulnerables.



Infraestructura Priorizada

Foco del Reporte:

Agua potable y saneamiento básico.

Otras Líneas de Inversión:

Infraestructura vial, educativa, de salud, energía, conectividad y vivienda.



7. SEGUIMIENTO
A METAS





9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE
PROYECTOS


Balance General (2022 -2026)

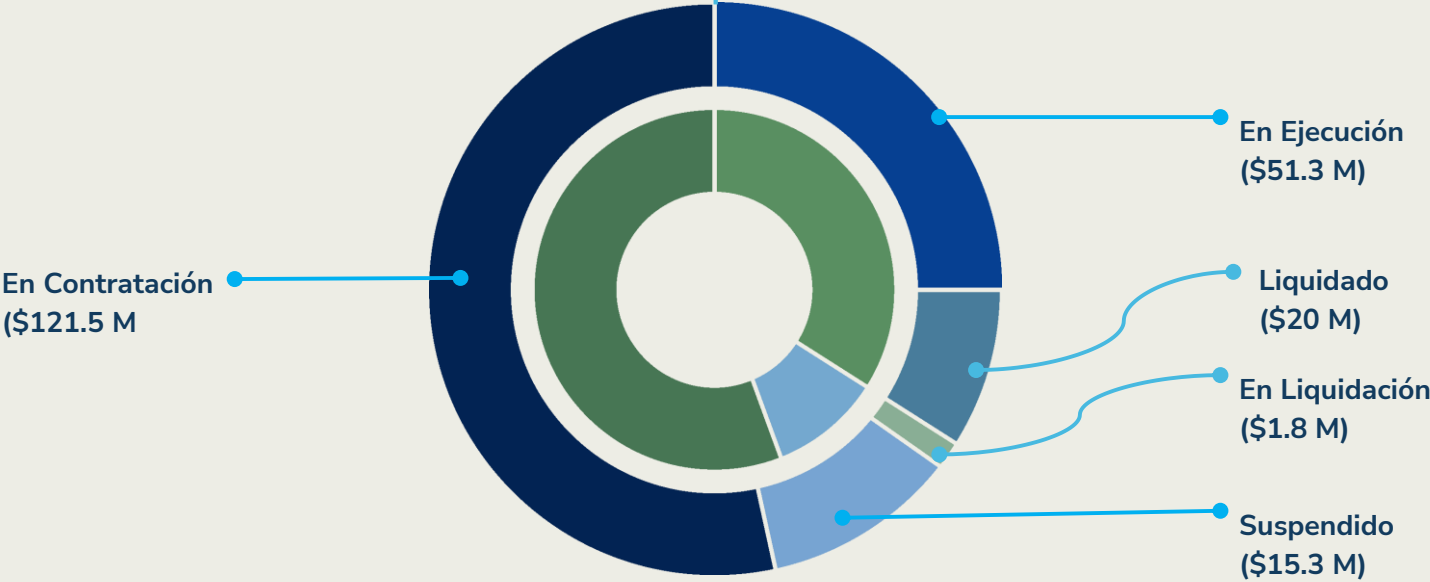

Un despliegue de capital sin precedentes enfocado directamente en las regiones más vulnerables del país.

El Mapa de Inversión Geográfica

Capital privado desplegado estratégicamente en territorios PDET y ZOMAC.

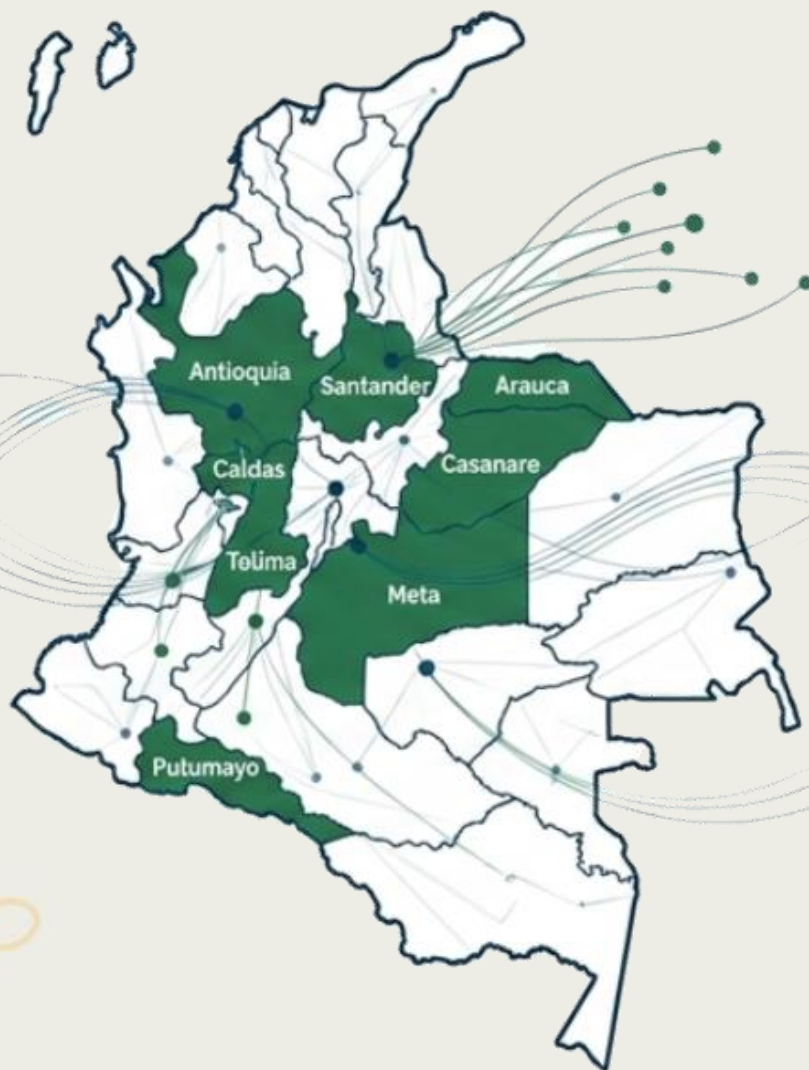

Antioquia: Lidera el volumen de inversión con mega-proyectos en Turbo, Caucasia, Nechí y Sonsón.



Arauca y Casanare: Alta concentración de proyectos individuales enfocados en ruralidad (Tame, Arauquita, Aguazul, Maní).



Santander: Foco intensivo en saneamiento para vivienda rural dispersa (Charta, Suratá, Matanza).



Sur y Eje Cafetero: Intervenciones clave en Putumayo (Puerto Asís), Caldas (Anserma y región) y Tolima (Rioblanco).



7. SEGUIMIENTO
A METAS



9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS




5. GESTIÓN DE
PROYECTOS

A woman with dark hair in a ponytail, wearing a leopard print shirt, is looking upwards and to the right. In the background, a man wearing a blue cap and a light blue shirt is visible. The scene appears to be indoors, possibly in a meeting or presentation setting.

2.3 Proyectos CONPES Declarados de Importancia Estratégica -DIE

2.3.1 Proyecto de inversiones estratégicas para el cierre de brechas

Proyectos Declarados de Importancia Estratégica Nacional

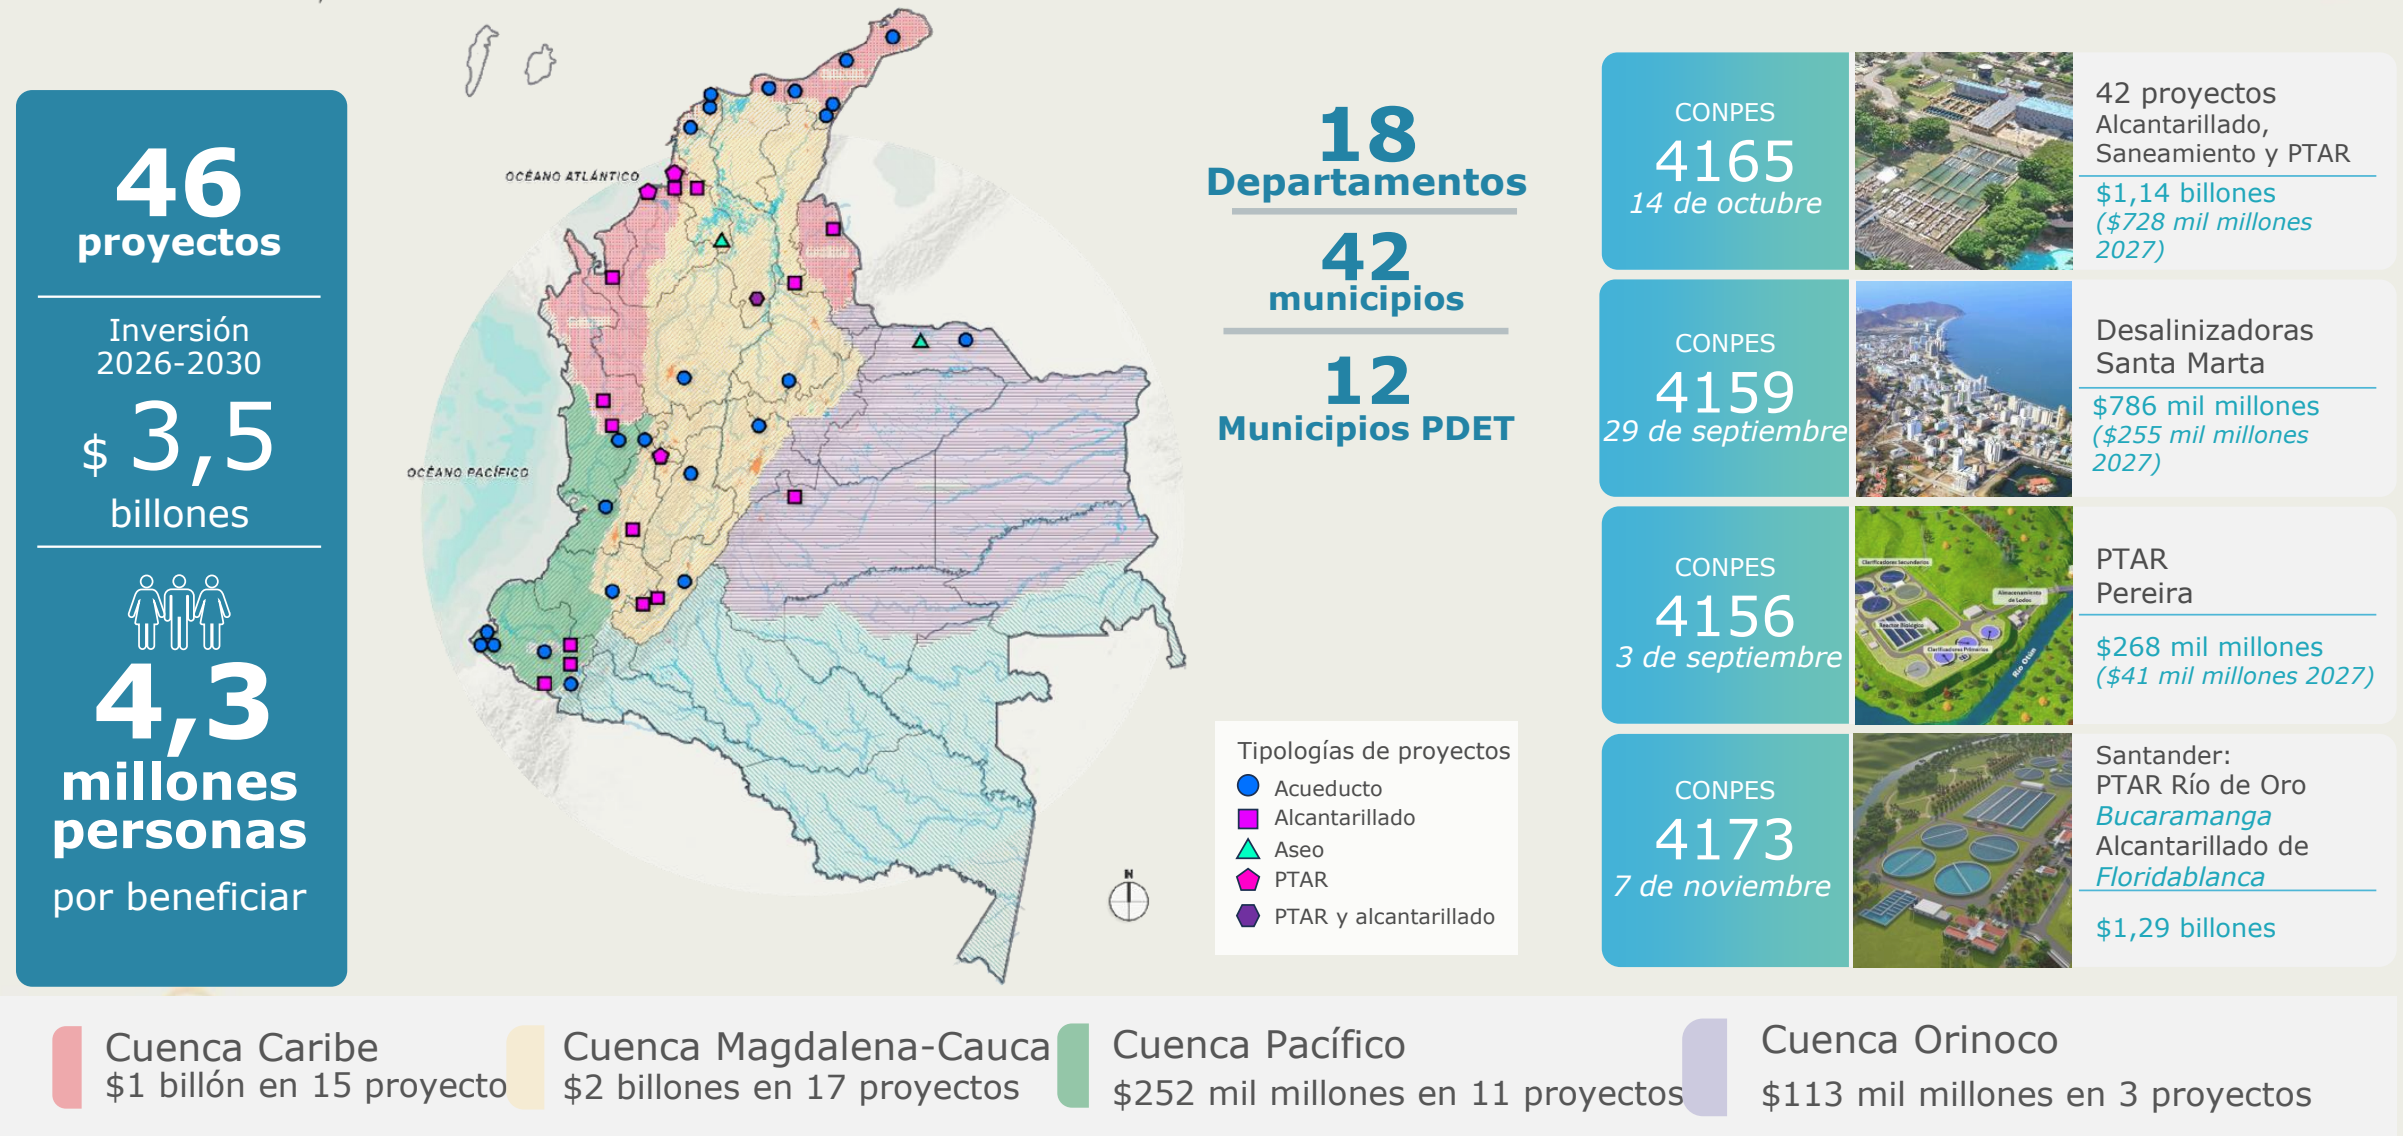

Esquema de financiación de largo plazo para la ejecución de 46 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento básico.

Proyecto de Inversión

Incremento del acceso al agua y del saneamiento básico para la sostenibilidad y equidad territorial a nivel nacional


BPIN 202500000025366

\$309.001
Millones
PGN 2026

99,78%
comprometido

Los \$600 millones permitirán inversiones en mejoras en sistemas de información

VIGENCIAS FUTURAS PROGRAMADAS
Cifras en billones

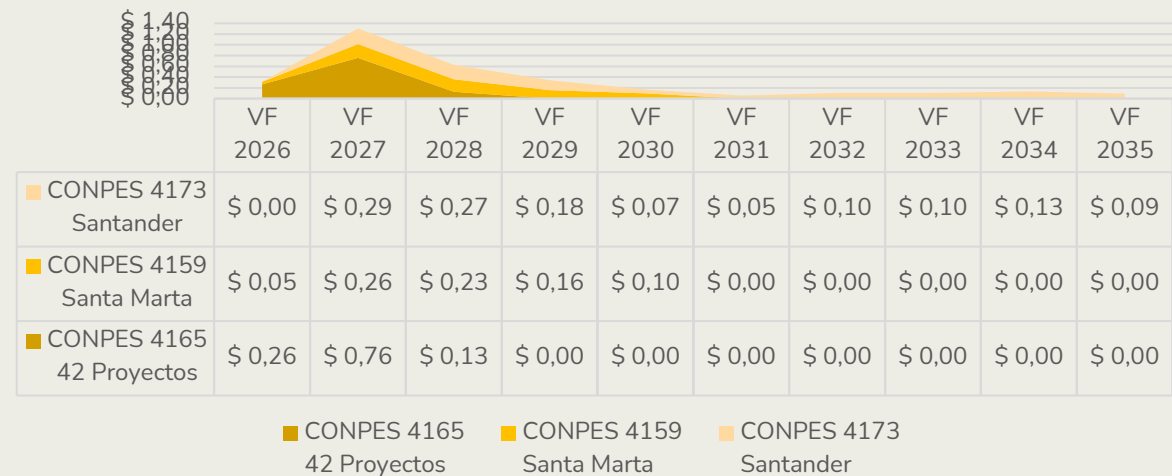

\$3,5 Billones
2026 - 2035

\$1,4 millones
24 proyectos de Acueducto

\$2,1 millones
22 proyectos Alcantarillado, Aseo y Tratamiento de aguas residuales



7. SEGUIMIENTO A METAS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



5. GESTIÓN DE PROYECTOS

Estado de avance de los proyectos declarados de importancia estratégica a cargo de la DIDE

Número de proyectos e hitos cumplidos

CONPES 4159



CONPES 4165



CONPES 4173



Corte 30 de junio de 2026



2.3.2 Políticas de mediano y largo plazo pendientes de aprobación

Documentos CONPES de Declaración de Importancia Estratégica del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio EN TRÁMITE


Documento CONPES	Nombre	Estado actual	No. de subproyectos	
CONPES En Trámite de Aprobación	Declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en el Distrito Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura Valle del Cauca – 11 SUBPROYECTOS	1. Aval fiscal otorgado 2. Documento CONPES revisado por DNP 3. Pendiente programar sesiones de PreCONPES y de CONPES	11	4 intervenciones en el sistema de acueducto urbano 3 intervenciones en el sistema de alcantarillado urbano 1 intervenciones de abastecimiento de agua potables en zonas rurales 4 intervenciones de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales

Inversión
\$276.973
millones
2026 - 2029

				Millones
Año	Recursos de la vigencia	Vigencias futuras ordinarias	Vigencias futuras excepcionales	Total
2026	\$ 45.449			\$ 45.449
2027		\$ 60.046	\$ 72.595	\$ 132.641
2028		\$ 2.319	\$ 7.744	\$ 10.063
2029		\$ 0	\$ 88.820	\$ 88.820
Total	\$ 45.449	\$ 62.365	\$ 169.159	\$ 276.973



**El Agua Como Bien
Común y eje de la vida**



**Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS!**

2.4 Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado

El Ordenamiento territorial alrededor del agua, se fortalece con los Planes Maestros de Agua y/o Alcantarillado

Existen
124
Proyectos activos en mecanismo


Requieren inversiones por \$3,05 billones

- 84 proyectos – En revisión Documental (\$1,92 billones)
- 15 proyectos – En mesa o requerimiento (\$177.403 millones)
- 25 proyectos – En Evaluación (\$958.216 millones)

13 CONCEPTOS
Favorables sin Financiación por
\$205.202
millones



Agosto 2022

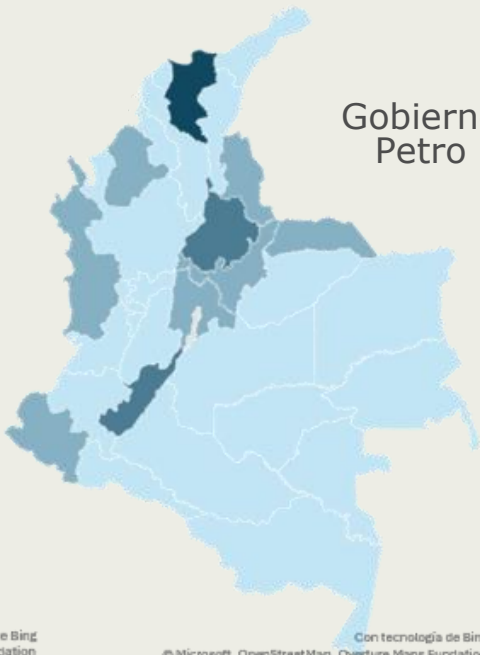

Gobierno Petro

Se gestionaron **47 Planes Maestros** a nivel nacional

Estado	Cant.	Aporte Nación	Valor total
En ejecución	32	\$ 330.789	\$ 526.804
Terminado	13	\$ 25.863	\$ 98.789
Vigencias Futuras	2	\$ 34.055	\$ 35.308
Total general	47	\$ 390.707	\$ 660.901

El 59,11% ha sido aportado por la Nación.


2.5 Proyectos Financiados por Banca Internacional



An aerial photograph of a town nestled in a valley. A wide, light-colored river flows along the left side of the town. The town itself is densely packed with buildings, mostly with red-tiled roofs. The surrounding landscape is lush green with hills and fields. The text is overlaid in the center of the image.

2.5.1 Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa

Préstamo BID 4446/OC-CO

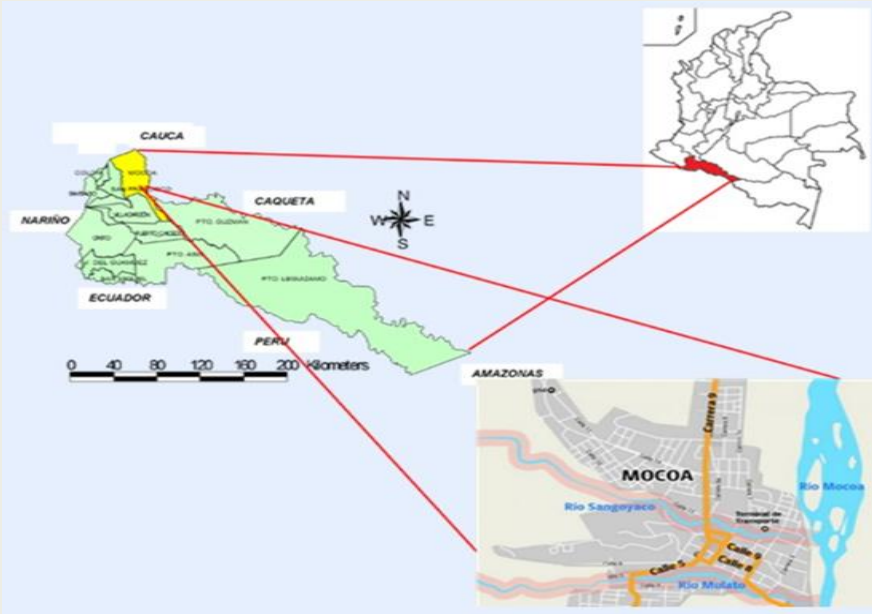

REFORMULACIÓN PROYECTOS



Redes Fase I , PTAR y Fortalecimiento Fase II

100%

GESTIÓN PREDIAL



Predio de la PTAR, Colectores y Descole

71%

FORTELECIMIENTO INSTITUCIONAL



Formación Técnica, Catastro Comercial y Estudio Costos y Tarifa

88%

EJECUCIÓN DE OBRAS



Ejecución 10km de Colectores e Inicio obras de la PTAR

44,0%

AÑO	CDP	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
2022	99,9%	99,9%	3,3%	3,3%
2023	99,7%	99,7%	4,6%	4,6%
2024	99,4%	99,4%	94,3%	94,3%
2025	100,0%	100,0%	98,1%	98,1%
2026	99,6%	99,5%	49,2%	49,2%



Resultados Alcanzados

1

Reformulación Técnica y Presupuestal

Reformulación de tres proyectos neurálgicos con ajuste de presupuestos por inflación y TRM

2

Expropiación Administrativa

Terreno registrado a nombre del Municipio el 4 de septiembre de 2025. Inicio Fase 3

3

Consultorías Aguas Mocoa S.A.

Culminación con 100% de ejecución: catastro, costos y modelo financiero

4

Avance en Obras Civiles

10 kilómetros de redes de colectores e interceptores en ejecución



5. GESTIÓN DE
PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS




7. SEGUIMIENTO
A METAS

A group of approximately 15 people are seated around a large, dark wooden conference table in a modern meeting room. The room has a drop ceiling with square light fixtures. In the background, a large blue wall features the CAF logo and the text "BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE" repeated in a grid pattern. Two flags are visible: the flag of Ecuador on the left and the flag of Honduras on the right. Several laptops are open on the table, and some participants are looking at their screens while others are engaged in conversation. A glass of water sits on the table in the foreground.

2.5.2 CAF BUENAVENTURA

Distrito de Buenaventura

Resultados del periodo de gobierno y solicitud de inversión 2027

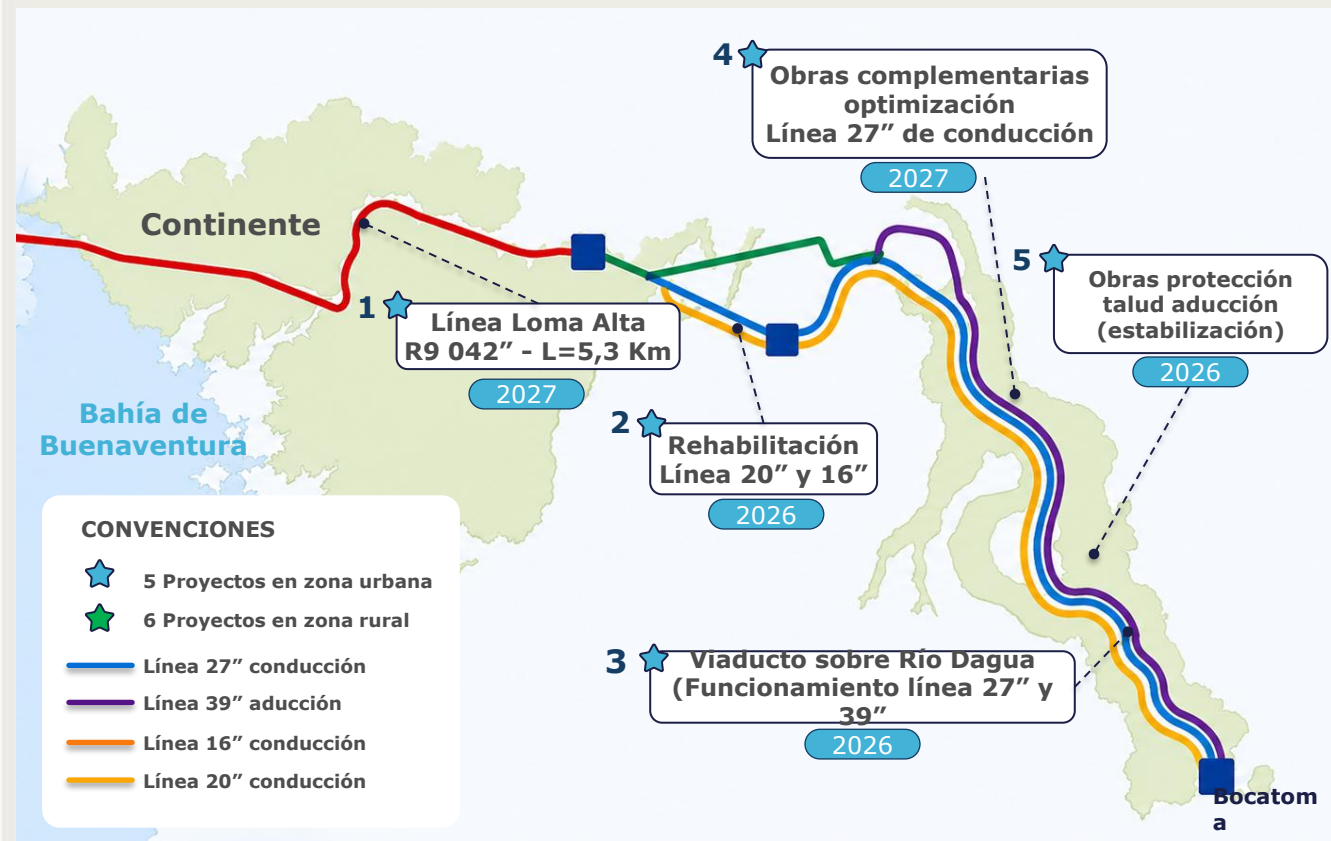

- ### Proyectos rurales
- 6 ★ Construcción 4 sistemas de acueducto zona rural (La Triana – Invasión) 2027
 - 7 ★ E&D 19 comunidades rurales 2026
 - 8 ★ E&D 9 comunidades rurales 2026
 - 9 ★ Implementación programa pilas públicas 2026
 - 10 ★ Grupo 1 y 3: E&D 11 veredas 2026
 - 11 ★ E&D Tratamiento aguas residuales 2026

Inversiones en curso

\$9.563 millones

Obras complementarias PTAP Escalerete y PTAP Venecia Zona Urbana (Terminado)

Construcción del sistema de abastecimiento y saneamiento colectivo para la Vereda de Agua Clara (En Ejecución)

CONPES

\$276.972 millones
(4 años)

11
Proyectos

5 Urbanos | 6 Rurales

335.217
Personas a beneficiar


Aval fiscal por MinHacienda y Sesión CONPES programada para julio por DNP



2.5.3 BID GUAJIRA



Préstamo BID 5193/OC-CO

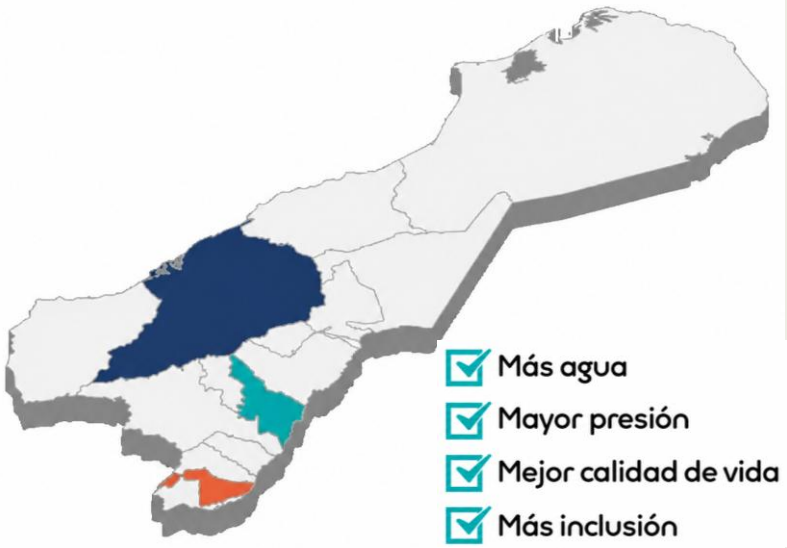

ACUEDUCTO RIOHACHA



Inversión
\$67.840

Beneficiarios
212.000

93,4%

ACUEDUCTO FONSECA



Inversión
\$80.403

Beneficiarios
43.000

90,8%

ACUEDUCTO URUMITA



Inversión
\$21.074M

Beneficiarios
10.700

80,4%

ALCANTARILLADO FONSECA



Inversión
\$39.648

Beneficiarios
3.375

75,1%

Fortalecimiento Institucional



Ciencia

Laboratorio Corpoguajira
Unidad Móvil para el monitoreo
de la calidad del agua.



Formación Técnica

4 Carreras técnicas
con CETSCA
Prioridad 30% Mujeres



Gestión Operativa

Aumento del recaudo
Gestión de la demanda
Fortalecimiento del Operador



Comunidad

Estrategia "Palabra Guajira"
Cultura del cuidado del agua
Talleres de enfoque de Género.

Inversión: \$5.000 MILLONES



5. GESTIÓN DE
PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS




7. SEGUIMIENTO
A METAS

2.6 PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA PDA



Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)



El Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) es el instrumento de planeación y coordinación interinstitucional por el cual los departamentos y municipios participantes articulan de acuerdo con las fuentes de financiación disponibles, el desarrollo de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, así como el fortalecimiento de la prestación eficiente de estos servicios en su territorio.

RESULTADOS DESTACADOS PDA 2022-2026

32 PDA acompañados técnica y financieramente.

1.009 municipios y 18 Áreas No Municipalizadas (ANM) vinculadas.

\$14,31 billones gestionados históricamente por la estrategia PDA:

- \$12,20 billones en recaudo de recursos.
- \$2,11 billones en rendimientos financieros del Patrimonio Autónomo FIA.

64 % de los recursos provienen del SGP-APSB de departamentos y municipios.

\$1,93 billones gestionados por la Nación:

- \$854 mil millones de Audiencias Públicas.
- \$1,08 billones del Presupuesto General de la Nación.

\$5,85 billones ejecutados entre 2022 y junio de 2026 en el marco de los PDA.

EN QUÉ CONSISTEN ESTOS RESULTADOS


Los PDA son el principal instrumento de articulación entre la Nación, departamentos y municipios para la planeación y ejecución de inversiones en agua potable y saneamiento básico.

La estrategia moviliza y organiza recursos de múltiples fuentes, promoviendo la concurrencia entre el SGP-APSB, la Nación y otras fuentes para financiar proyectos en todo el territorio.

El acompañamiento técnico permanente, la participación en Comités Directivos y el seguimiento a los Planes Estratégicos de Inversiones (PEI) y a los Convenios de Uso de Recursos (CUR) fortalecen la gobernanza y la toma de decisiones en los territorios.

La implementación de herramientas de seguimiento (Visores PDA), la Mesa Estratégica de Articulación y Seguimiento PDA y la expedición de la Circular 055 de 2026 mejoran la transparencia, la articulación institucional y la gestión basada en información.

Las inversiones ejecutadas se traducen en proyectos de infraestructura que mejoran el acceso, la calidad y la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico para la población.

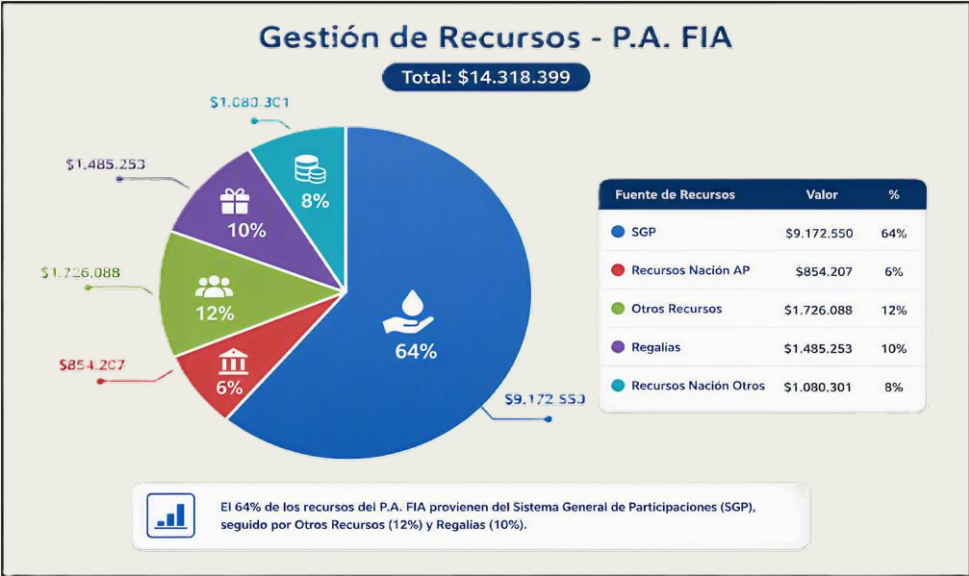

5. GESTIÓN DE PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



7. SEGUIMIENTO A METAS



PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA

EJECUCIÓN PLAN DE INVERSIONES PEI

ANÁLISIS CONCLUYENTE 2022 - 2025

(Cifras en millones de pesos)




AÑO / CAPÍTULO	APROBADO PEI (millones de \$)	EJECUTADO PEI (millones de \$)	% EJECUCIÓN PROMEDIO	VARIACIÓN EJECUCIÓN vs. AÑO ANTERIOR (p.p.)
2022	\$ 3.067.000	\$ 2.042.122	67%	—
2023	\$ 3.643.323	\$ 2.127.453	58%	-9 p.p.
2024	\$ 2.804.411	\$ 1.353.967	48%	-10 p.p.
2025	\$ 3.158.697	\$ 2.091.789	62%	+14 p.p.
TOTAL 2022 - 2025	\$ 12.673.431	\$ 7.615.331	60%	—



En el periodo 2022 – 2025, los 32 Planes Departamentales de Agua aprobaron recursos por **\$ 12,67 billones** y ejecutaron **\$ 7,62 billones**, alcanzando una ejecución financiera promedio del **60%**.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA PROMEDIO

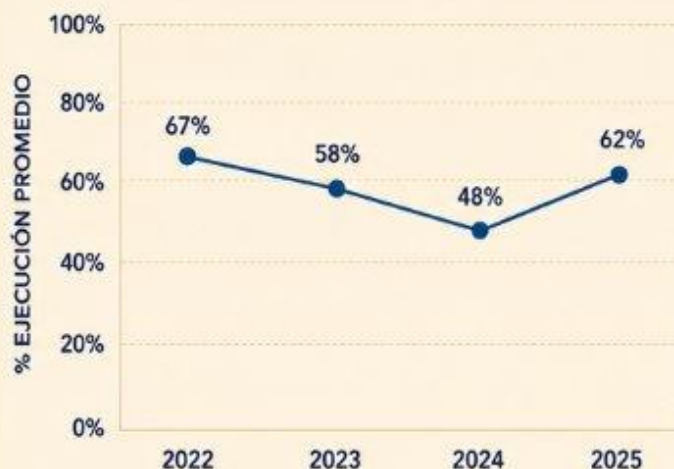

COMPARATIVO RECURSOS APROBADOS VS. EJECUTADOS



INDICADORES CLAVE 2022 - 2025

 Recursos aprobados (total 2022 - 2025)	\$ 12,67 billones
 Recursos ejecutados (total 2022 - 2025)	\$ 7,62 billones
 Ejecución financiera promedio 2022 - 2025	60%
 Mejor variación anual (2024 vs. 2025)	+14 p.p.

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)

LINEAMIENTOS CLAVE PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA Y RESULTADOS DE LOS PDA



1. FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Mantener y consolidar la coordinación entre Nación, departamentos, municipios, gestores y entidades del sector para asegurar alineación de criterios, priorización de inversiones y toma de decisiones oportuna.



2. IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE LOS PEI Y CUR

Priorizar el seguimiento y la aprobación oportuna de los Planes Estratégicos de Inversiones (PEI) y la gestión efectiva de los Convenios de Uso de Recursos (CUR) para acelerar la ejecución de proyectos.



3. CONSOLIDAR EL SEGUIMIENTO BASADO EN EVIDENCIA

Continuar fortaleciendo los visores PDA y la calidad de la información para garantizar seguimiento en tiempo real, identificación de alertas tempranas y evaluación del impacto de las inversiones.



4. AMPLIAR Y ESPECIALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA

Mantener la estrategia de asistencia técnica diferenciada y focalizada, fortaleciendo capacidades en planeación, estructuración, gestión predial, contratación y ejecución de proyectos.



5. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LOS PDA

Promover la concurrencia de recursos, optimizar el uso del SGP-APSB y gestionar nuevas fuentes de financiación para garantizar la continuidad y escalabilidad de las inversiones.



6. FORTALECER LA GOBERNANZA Y LA TOMA DE DECISIONES

Garantizar el funcionamiento eficaz de los Comités Directivos de los PDA y la Mesa Estratégica de Articulación y Seguimiento para mejorar la gestión de riesgos y la priorización de inversiones.



7. FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA CALIDAD

Incorporar de manera sistemática los análisis de riesgo, calidad del agua y sostenibilidad de los sistemas en la planeación y seguimiento de los proyectos.



8. DAR CONTINUIDAD A LOS LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS

Implementar de manera efectiva la Circular 055 de 2026 y sus lineamientos, y mantener actualizados los instrumentos, guías y herramientas desarrolladas para la gestión integral de los PDA.



OBJETIVO COMÚN

Continuar fortaleciendo los PDA como el principal instrumento de articulación y ejecución de inversiones en agua potable y saneamiento básico, contribuyendo al cierre de brechas y al bienestar de las comunidades.



2.7 PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PCI



Programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico (pci)



Objetivo

Garantizar el acceso efectivo a los servicios de agua potable y saneamiento básico.



Desde 2012

Implementado en todo el país.



Estratos 1 y 2

Cuando técnicamente se requiera.



Impacto

Contribuye al cierre del ciclo de las inversiones realizadas en el sector.

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico (PCI), implementado desde 2012, tiene como objetivo complementar la infraestructura de acueducto y alcantarillado mediante la **construcción y mejoramiento de las conexiones domiciliarias e intradomiciliarias** en viviendas **de los estratos 1 y 2, cuando técnicamente se requiera**, garantizando el **acceso efectivo a los servicios de agua potable y saneamiento básico** y contribuyendo al cierre del ciclo de las inversiones realizadas en el sector.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?



LIDERAZGO Y ARTICULACIÓN



Liderado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Liderado por las Entidades Territoriales



BENEFICIOS DEL PROGRAMA



Mejora el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico.



Mejora la calidad de vida y la salud de las familias beneficiarias.



Cierre de brechas en infraestructura y equidad territorial.



Optimiza y garantiza la sostenibilidad de las inversiones del sector.



5. GESTIÓN DE PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS




7. SEGUIMIENTO A METAS

Programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico (pci)




Programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico (PCI)

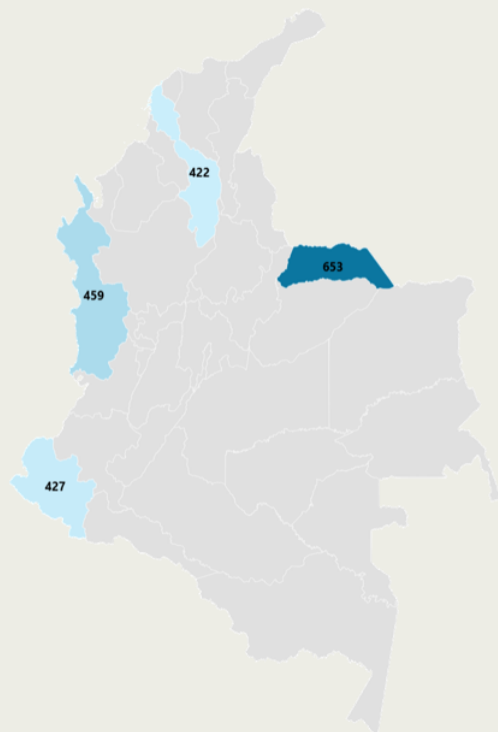

Contrato 1083 de 2022

- ✓ Conexiones viabilizadas: **1.931**
 - ✓ Conexiones entregadas: **1.381**
 - ✓ Departamentos intervenidos: **4**
 - ✓ Municipios intervenidos: **6**
- Contrato terminado y en liquidación**

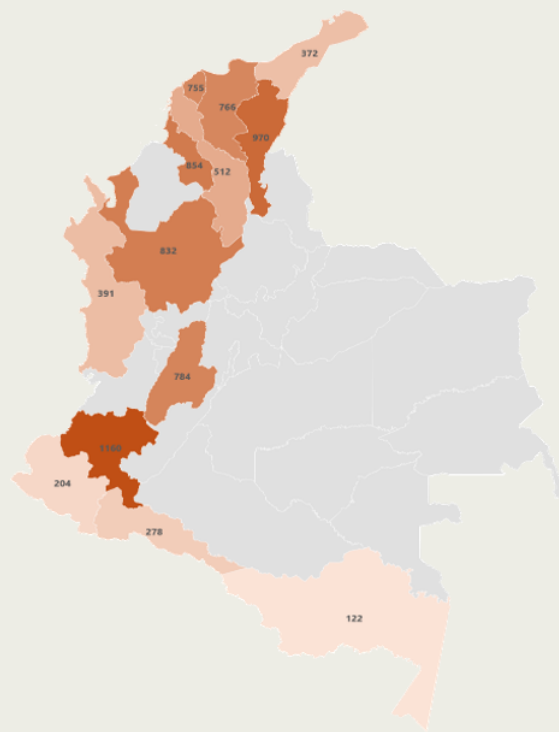

Contrato 1632 de 2023

- ✓ Conexiones viabilizadas: **8.000**
 - ✓ Conexiones entregadas: **1.092**
 - ✓ Departamentos intervenidos: **13**
 - ✓ Municipios intervenidos: **20**
- Contrato en ejecución**

CUR 1500 de 2025

Villavicencio, Meta

- ✓ Conexiones viabilizadas: **195**
- En ejecución**

CI 1439 de 2025 y CIC 1447 de 2025

Ocaña, Norte de Santander

- ✓ Conexiones viabilizadas: **350**
- Por iniciar ejecución**

MECANISMO DE VIABILIZACIÓN

- ✓ Proyectos radicados: **31**
- ✓ Departamentos participantes: **9**
- ✓ Municipios postulados: **31**
- ✓ Municipios PDET: **5**
- ✓ Proyecto viabilizado con financiación: **1 (PDET)**



5. GESTIÓN DE
PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS



7. SEGUIMIENTO
A METAS

Programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico (PCI) - LOGROS



1. Fortalecimiento normativo

Consolidar lineamientos técnicos mediante actos administrativos que otorguen seguridad jurídica y estabilidad institucional.



2. Presencia territorial permanente

Mantener asistencia técnica presencial y articulación constante con entidades territoriales y prestadores.



3. Mejora continua de procesos

Optimizar estructuración, evaluación, viabilización y seguimiento para reducir tiempos y fortalecer la gestión documental.



4. Enfoque social

Mantener la focalización del PCI para cerrar brechas de acceso al agua potable y saneamiento en hogares vulnerables.



5. Planeación territorial

Promover la incorporación temprana de proyectos PCI en los instrumentos de planeación e inversión municipal.



Objetivo estratégico: consolidar un programa **sostenible**, con mayor **capacidad institucional**, **presencia territorial** y **seguridad jurídica** para ampliar el acceso al agua potable y saneamiento básico.



5. GESTIÓN DE PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



7. SEGUIMIENTO A METAS

2.8 HUELLA AZUL - CULTURA DEL AGUA SUBVENCIONES



Estrategia de Aseguramiento Huella Azul


Qué es, cómo nació y logros de la estrategia (enero – 30 de junio de 2026)

LOGROS DE LA
ESTRATEGIA (ENE – 30
JUN 2026)

Necesidad que dio origen a la Estrategia Huella Azul




Riesgo alto por segmento (IUS 2024)




¿Qué es? Estrategia de asistencia técnica del MVCT para fortalecer la gestión, sostenibilidad y desempeño de prestadores pequeños y rurales, mediante transferencia de capacidades y mejora continua.



ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

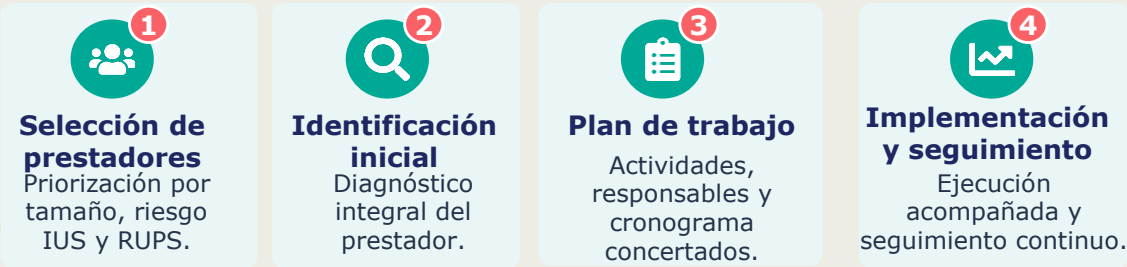

4 prestadores lograron saltos significativos en su Indicador Único Sectorial (IUS) con acompañamiento realizado en 5 meses

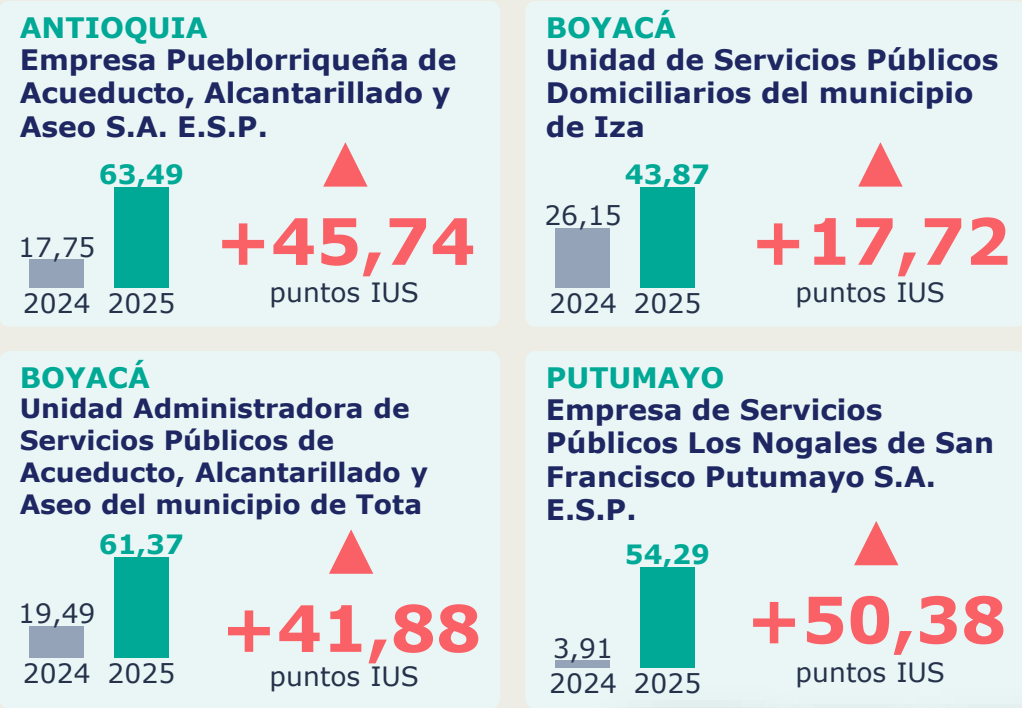

Fuente: Informe Sectorial de Acueducto y Alcantarillado · SSPD 2024 | Seguimiento Estrategia Huella Azul · MVCT, junio 2026



Próximos pasos y temas pendientes – Huella Azul

Acciones prioritarias para sostener y escalar los resultados alcanzados en 2025 y llegar a más prestadores

01

Estructurar un proyecto de inversión

Formular el proyecto que asegure los recursos humanos, técnicos y financieros para ampliar la cobertura en el mediano y largo plazo.

02

Promover articulación interinstitucional

Fortalecer alianzas con entidades nacionales, territoriales y cooperación internacional para ampliar capacidades y cobertura.

03

Mantener enfoque territorial y diferencial

Adaptar la estrategia a las condiciones particulares de cada prestador y territorio para maximizar el impacto.

TEMA PENDIENTE PRIORITARIO

Se requieren mayores recursos para potenciar la estrategia

El ritmo de mejora logrado en 2026 depende de asegurar financiación adicional, personal técnico y herramientas tecnológicas que permitan ampliar el acompañamiento a más prestadores y sostener los resultados en el tiempo.



Recursos
financieros



Recursos
técnicos



humanos



5. GESTIÓN DE
PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN
DE PROYECTOS



7. SEGUIMIENTO
A METAS

Programa La Cultura Del Agua

¿Qué es?

Es un **programa técnico pedagógico**, que busca **fortalecer la relación** de las comunidades con el agua y el saneamiento básico, promoviendo la defensa del agua como bien común y la garantía del derecho humano al agua, mediante la **transformación de hábitos y comportamientos**.

¿Qué se hizo?

Trascender de la capacitación técnica al **reconocimiento** del agua **como bien común** y su **acceso** como un **derecho humano** fundamental.

Buscar apoyo financiero y técnico con el BID, para la reformulación técnica y pedagógica del programa

Alcance Dos frentes de acción

Capacitaciones realizadas por el MVCT

Público objetivo: Comunidad

4 ejes temáticos / 14 módulos / diversidad de temáticas

Kit de herramientas

Público objetivo: Instituciones

Herramientas para Diagnóstico / diseño pedagógico-territorial / implementación / seguimiento, evaluación y aprendizaje.

Retos

Consolidar la Alianza con el Programa **Conexión Agua – BID**.

Pasar el Programa de la demanda territorial a la oferta institucional proactiva.



Estrategia de acompañamiento social unificada a los proyectos de agua y saneamiento básico con convenio de uso de recursos

¿Qué es?

Es una estrategia de acompañamiento y asistencia técnica a los ejecutores de proyectos y a las comunidades beneficiarias de los **proyectos de infraestructura financiados por la Nación**, diseñada para construir canales de comunicación, promover la participación informada, la transparencia de los recursos a través de la sostenibilidad de las obras y el control social, consolidando la gobernanza comunitaria.

¿Qué busca?

Disminuir la brecha entre lo técnico y lo social, manifestada en la falta de información oportuna, la resistencia comunitaria y el deterioro prematuro de la infraestructura

Consolidar la presencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en las regiones, transformando la dinámica entre la institucionalidad y la ciudadanía.

>

Cifras

88

Proyectos (**24** rurales y **64** urbanos) en **85** municipios de **21** departamentos

>300

Asistencias técnicas a proyectos

84

Veedurías ciudadanas conformadas

>

Retos

Inclusión del componente social en los requisitos de presentación de proyectos.

Designación de un profesional social por parte del ejecutor del Convenio y sus derivados.



5. GESTIÓN DE PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



7. SEGUIMIENTO A METAS

Subvención AECID Y Plan Rescate

COL-018-B · Todos por el Pacífico

ACCIONES CLAVE

17 proyectos terminados y entregados en el Chocó y otros municipios; ejecución del 84,90%.

\$144.000 M

inversión total · 65.846 habitantes beneficiados

RETO

Plan Rescate (Nóvita, Istmina y Medio Baudó) y continuidad del proceso jurídico del contrato 186/2010.

COL-035-B · Sector Rural

ACCIONES CLAVE

Obras en San Onofre y Fonseca; Sur Azul liquidado. Informe final radicado ante España (dic-2025).

10.643

habitantes beneficiados

RETO

Seguimiento a reintegros pendientes: \$174,8 M (ENTerritorio) y \$395,6 M (Aguas de Sucre).

PLAN RESCATE · NÓVITA, ISTMINA Y MEDIO BAUDÓ

ACCIONES CLAVE

- El Ministerio formuló el Plan Rescate para reactivar las obras de optimización de acueducto no terminadas.
- Findeter acompaña la ejecución (Contrato 438 de 2015) para reactivar los acueductos inconclusos.

Nóvita \$522 M Medio Baudó \$474 M · Istmina \$1.522 M

Convenios suscritos para actualización de estudios y diseños

RETO

Cierre financiero de los 3 proyectos (~\$41.000 M aprox) y peritaje judicial para la demanda en contra de Aguas y Aguas de Pereira(~\$1.511 M).

Entrega estudios y diseños Nóvita y Medio Baudó: Dic-2026

Entrega estudios y diseños Istmina: Jul- 2027



5. GESTIÓN DE PROYECTOS



9. DESCONGESTIÓN DE PROYECTOS



7. SEGUIMIENTO A METAS



2.9 LIQUIDACIONES

Estado liquidaciones — Convenios y/o contratos


167

Convenios y/o contratos terminados en liquidación


Estado Contratos y/o Convenios MVCT (129)

Dependencia a cargo de la supervisión	En Consolidación Documentación	Liquidado	Radicado a Contratos	Radicado a OAJ	Pendiente de Cierre	Radicado para Cierre	Total general
DIDE		9		11	2		22
Subdirección de Desarrollo Empresarial	8	3	2	1		1	15
Subdirección de Programas	13	7			2	1	23
Subdirección de Proyectos	32	20	3	14			69
Total general	53	39	5	26	4	2	129

Estado Contratos y/o Convenios FINDETER (38)

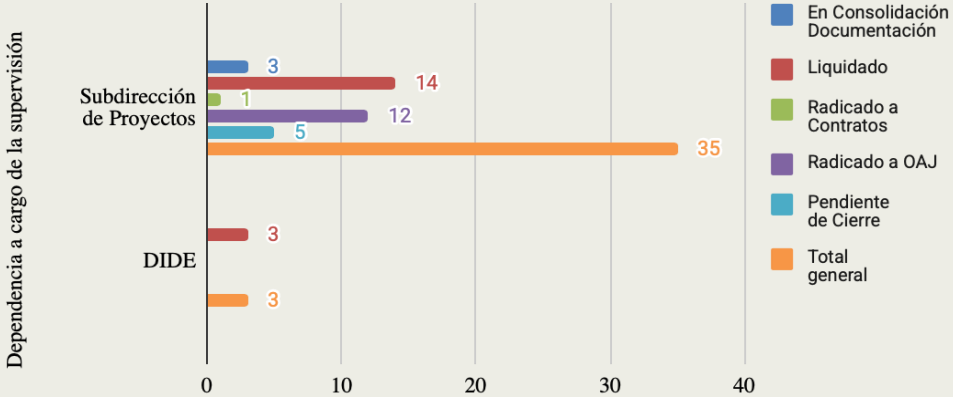

Dependencia a cargo de la supervisión	En Consolidación Documentación	Liquidado	Radicado a Contratos	Radicado a OAJ	Pendiente de Cierre	Total general
Subdirección de Proyectos	3	14	1	12	5	35
DIDE		3				3
Total general	3	17	1	12	5	38

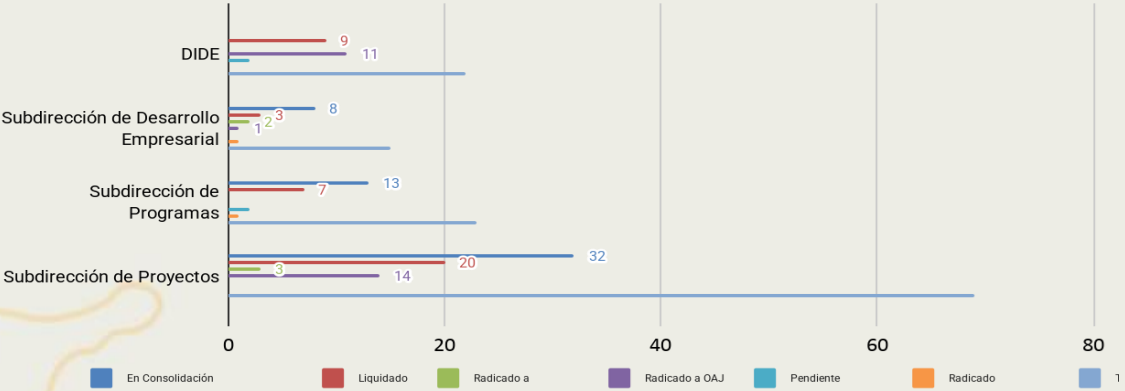

Bo
Empalme
ante el pueblo



Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

Con Dignidad,
¡CUMPLIMOS! ✓

